政達木業有限公司二廠 既設版橋及生活污水搭排梅花排水施工計畫書(含防汛計畫)

項目	內容
申請人	政達木業有限公司二廠(統一編號 89497279),負責人陳文政
工廠地址	宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路 571-1 號(梅山段 349 地號)
施工地點	梅山段 329 地號(水利用地,梅花排水),廠區正門口前
承受水體	梅花排水(宜蘭縣政府管理之區域排水)
編製日期	中華民國 115 年 11 月

一、工程概要

1. **生活污水搭排**:廠內生活污水經既有化糞池處理後,以 PVC 管(管徑 100 mm)埋設至梅山段 329 地號,於梅花排水護岸設介入口排放。日最大排放量 2.25 立方公尺、年 821.25 立方公尺。已經農業部農田水利署 115 年 10 月 28 日農水宜字第 1158104356 號函許可使用水利用地。
2. **既設版橋**:廠區正門口跨越梅花排水之鋼筋混凝土版橋一座,長 4.9 公尺、寬 7.6 公尺,渠內無橋墩,已施設完成,本次併案補辦,**不另施工**。

二、施工方式

1. 縣府核准後,選定施工廠商,施工前 7 日函報縣府並通知農田水利署羅東工作站會同放樣。
2. 開挖管溝、埋設 PVC 管,接頭密封、通水試驗無滲漏。
3. 護岸以鑽孔方式開孔(約 φ15 cm),置入管口後以無收縮水泥砂漿封填;管口高於渠道常水位,不突出妨礙通水;介入口避開版橋橋臺。
4. 砂回填夯實,路面及護岸依原狀復舊,清除渠道內殘料。
5. 預定工期約 5 個工作天,不阻斷渠道通水。
6. 完工後檢附竣工照片報請縣府竣工查驗,並依農田水利署許可函報羅東工作站;查驗合格後懸掛許可證明標示牌。

三、防汛計畫

1. 以 12 月至翌年 4 月施工為原則,避開防汛期。
2. 中央氣象署發布豪雨特報或颱風警報時,停止施工;開挖處回填或覆蓋,開孔處以沙包封堵,機具撤離渠道。
3. 現場備沙包、抽水機、防水布。
4. 版橋:每年防汛期前及颱風前清除橋下淤積、漂流物;災後檢查橋面及橋臺。
5. 緊急聯絡:宜蘭縣政府水利資源處 (03)925-1000 分機 8152;農田水利署宜蘭管理處 (03)925-5000;申請人陳文政 0932-164882;消防救護 119。

四、承諾事項

1. 施工期間不阻斷渠道通水,土方及廢棄物不得棄置渠道。
2. 損壞水利設施、護岸或農路,由本公司負責修復或賠償。
3. 工程費用由本公司負擔;版橋及管線維護管理由本公司負責。
4. 許可期滿或經廢止時,自費拆除並回復原狀;主管機關認有妨礙通水時,依指示改善。

附件:圖說圖一至圖七、既設版橋現況照片表。

申請人:政達木業有限公司二廠　　負責人:陳文政　(蓋公司大小章)

圖一　位置圖（廣域）

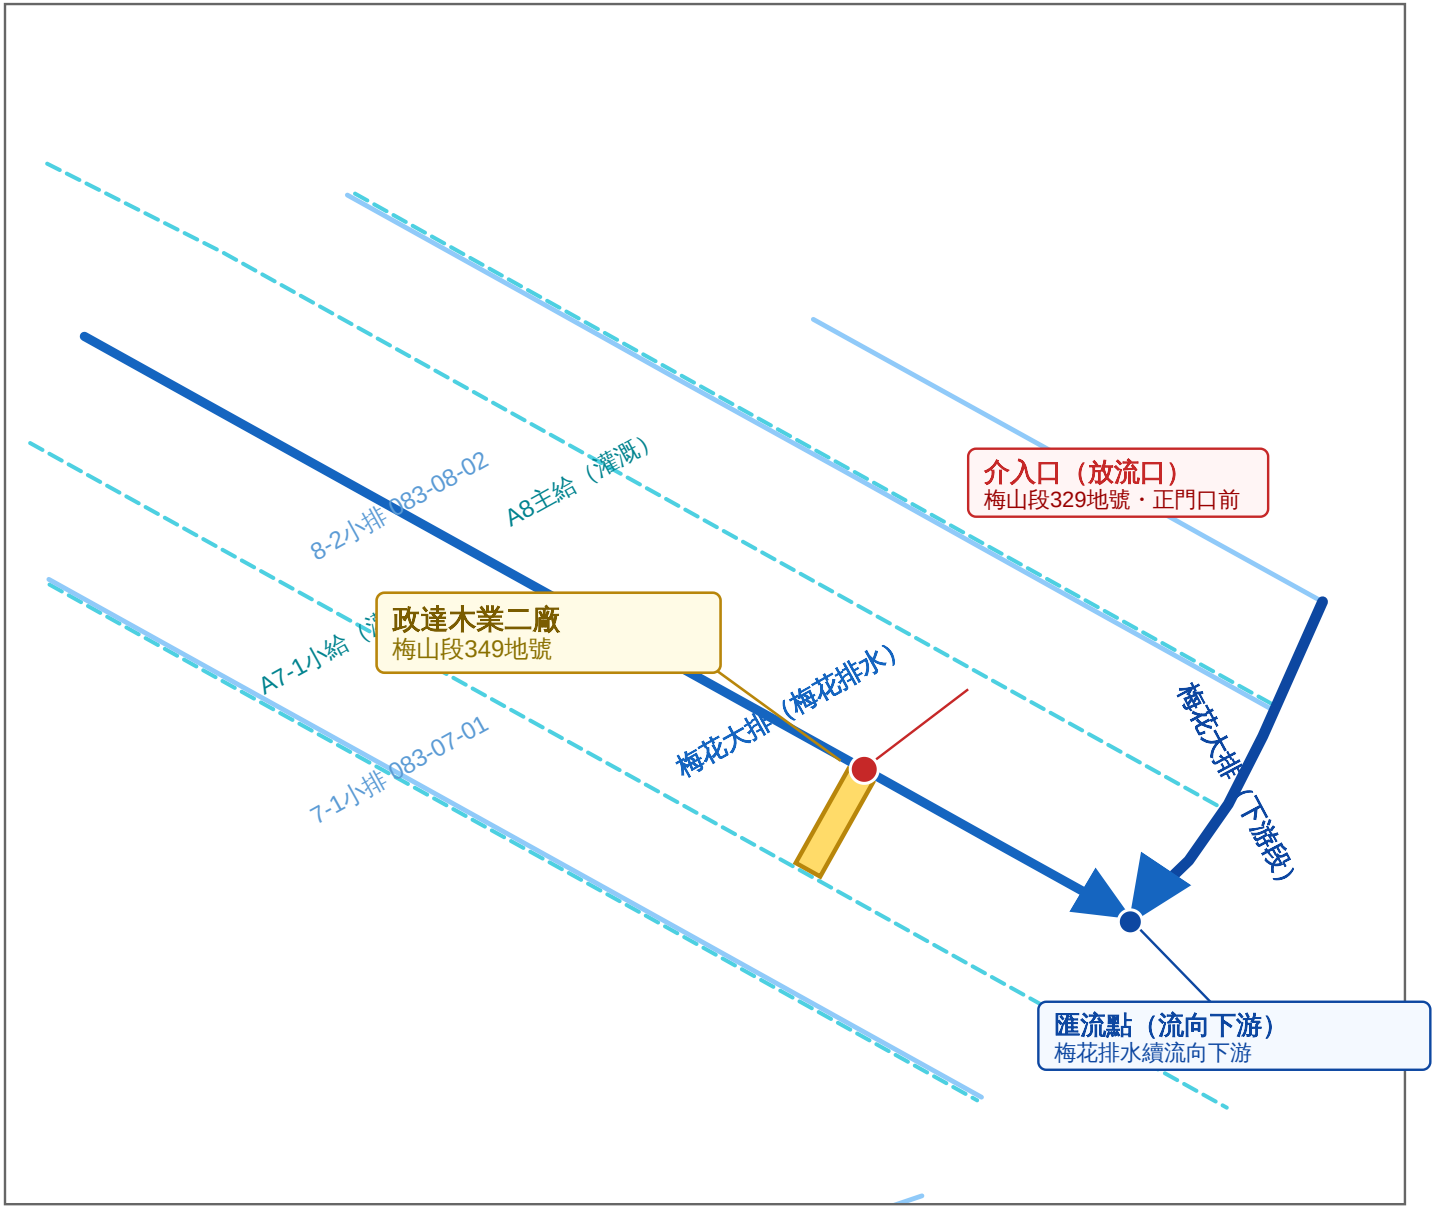


圖　例

- 政達木業二廠（梅山段349）
- 梅花大排（本次介入）
- 梅花大排下游段
- 其他排水渠道
- 灌溉渠道（不得排入）
- 介入口（放流口）
- 匯流點

放流口至承受水體流路

- ● 廠內化糞池／放流池（梅山段349）
- ▼ 介入口（梅山段329　水利用地）
- ▼ 梅花排水（梅山段329地號）
- ▼ 流向東南下游
- ▼ （宜蘭縣政府轄管區域排水）
- ▼ 梅花排水（圖外下游）

重要提醒

廠區西南側 4.1 公尺處為 A7-1小給，性質為「灌溉渠道」。依農田水利法第14條第1項，灌溉專用渠道原則禁止排放非農田排水，本案放流口不得設於該渠道，須由東北側接入梅花排水。

比例尺　約 1：7019（A4 橫向）

0　100　200　300　400　公尺

N


底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處「農田水利渠道查詢系統」渠道圖層（Canal民眾查詢1140917）
查詢日期 115.08.28　座標系統 TWD97 二度分帶（EPSG:3826）
註：渠道線形為圖資，僅供位置參考；實際位置及流向依現地與管理處初勘為準。

圖一　位置圖（廣域）

廠區位置與排水系統，放流口至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排　｜　TWD97 二度分帶　｜　第 1 張，共 6 張

圖二　介入點位置圖（平面圖）

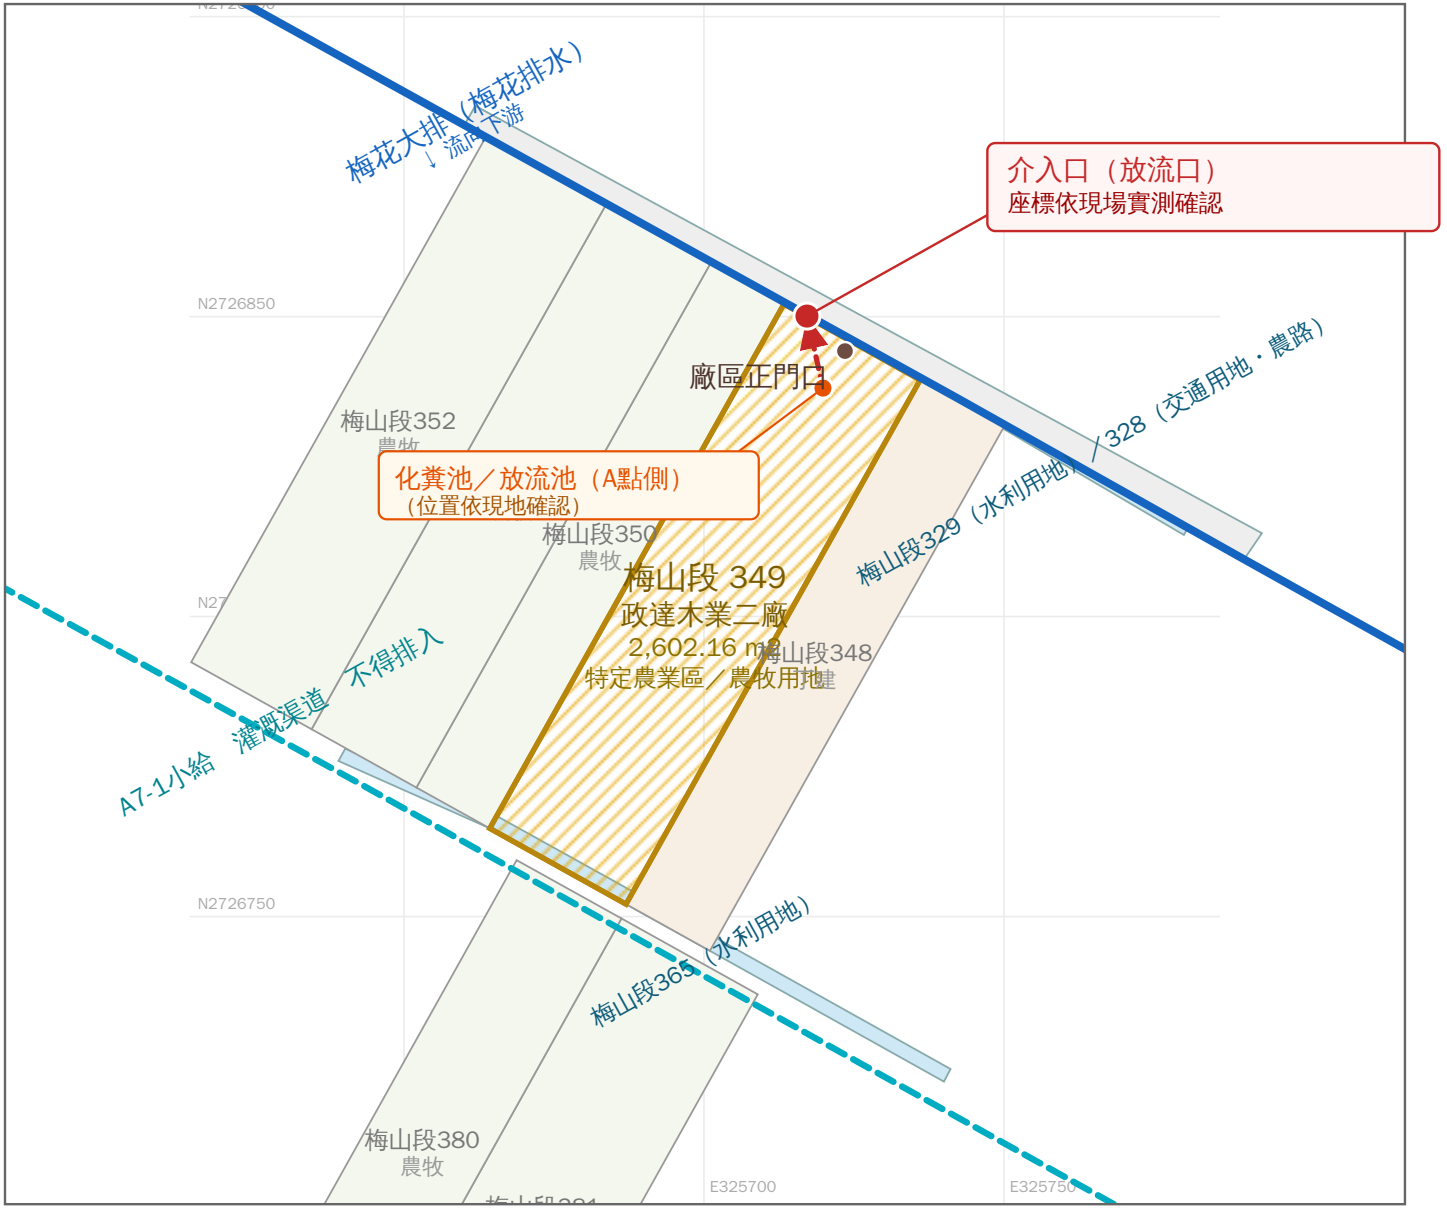

比例尺　約 1：1260（A4 橫向）

0　20　40　60　80　公尺

N

底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處「農田水利渠道查詢系統」
地籍圖層 1140ct地籍圖／渠道圖層 Canal民眾查詢1140917　查詢日期 115.08.28
註：渠道中心線為圖資線形，與現地略有偏差；介入口位置、椿號、坐標及渠道斷面依初勘實測為準。

圖　例

- 申請搭排土地（梅山段349）
- 水利用地（329／365）
- 交通用地（328　農路）
- 農牧用地
- 丁種建築用地
- 排水渠道　梅花大排（可搭排）
- 灌溉渠道　A7-1小給（禁止排入）
- 擬設放流管線
- 介入口（放流口）
- 化糞池／放流池

介入渠道：梅花排水（梅花大排）

放流口至承受水體流路

- ● 廠內化糞池／放流池
- ▼ 介入口（梅山段329地號）
- ▼ 梅花排水（本次介入承受水體）
- ▼ 流向下游（宜蘭縣政府轄管區域排水）
- ▼ 梅花排水（承受水體）

案件資料


申請人	政達木業有限公司二廠
負責人	陳文政
廠　址	冬山鄉得安村梅林路571-1號
納管編號	P0200190
排放水量	日最大 2.25 m³／年最大 821.25 m³

圖二　介入點位置圖（平面圖）

含放流口位置至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排

圖三　地籍圖套繪圖

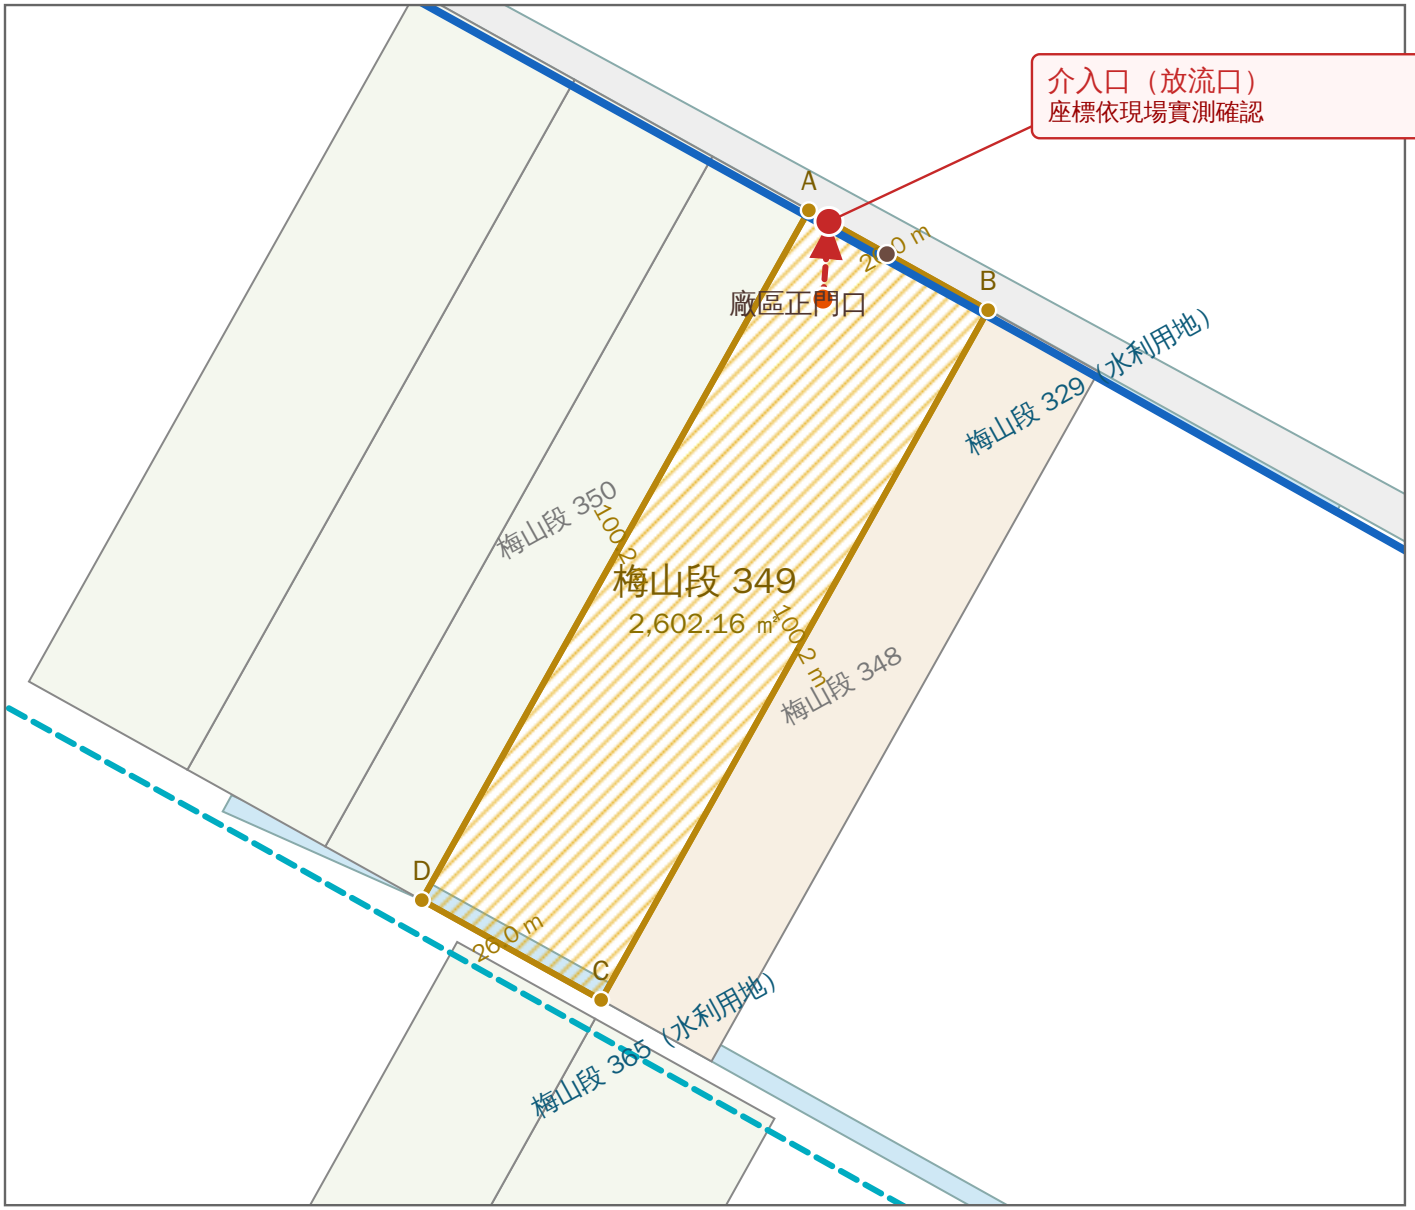

界址點坐標（TWD97 二度分帶）

點號	E（m）	N（m）
A	325713.33	2726852.09
B	325736.04	2726839.44
C	325687.01	2726752.07
D	325664.29	2726764.71

介入口　依現場實測　　確認

坐標為圖資推估值，界址以複丈鑑界結果為準。
介入口位置依管理處初勘確認。

土地標示

地　號	宜蘭縣冬山鄉梅山段349地號
重測前	梅花段 1708-0000
面　積	2,602.16 平方公尺
使用分區	特定農業區
用地類別	農牧用地
所有權人	陳文政（全部 1分之1）
謄本字號	羅東謄字第014081號
核發日期	民國115年8月28日

相鄰地號

東北：梅山段329（水利用地）← 介入口
西南：梅山段365（水利用地）
東南：梅山段348（丁種建築用地）
西北：梅山段350（農牧用地）

比例尺　約 1：958（A4 橫向）

0　10　20　30　40　公尺

N


底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處渠道查詢系統地籍圖層（1140ct地籍圖）；地籍圖謄本：宜蘭縣羅東地政事務所 羅東謄字第014081號（115.08.28，1/500）。
註：本圖為套繪示意，界址以複丈鑑界結果為準；正式送件請於地籍圖謄本正本上套繪搭排位置並簽章。

圖三　地籍圖套繪圖

搭排位置套繪於地籍圖

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
｜　TWD97 二度分帶　｜　第 3 張，共 6 張

圖四　借用他人土地　管線位置圖說

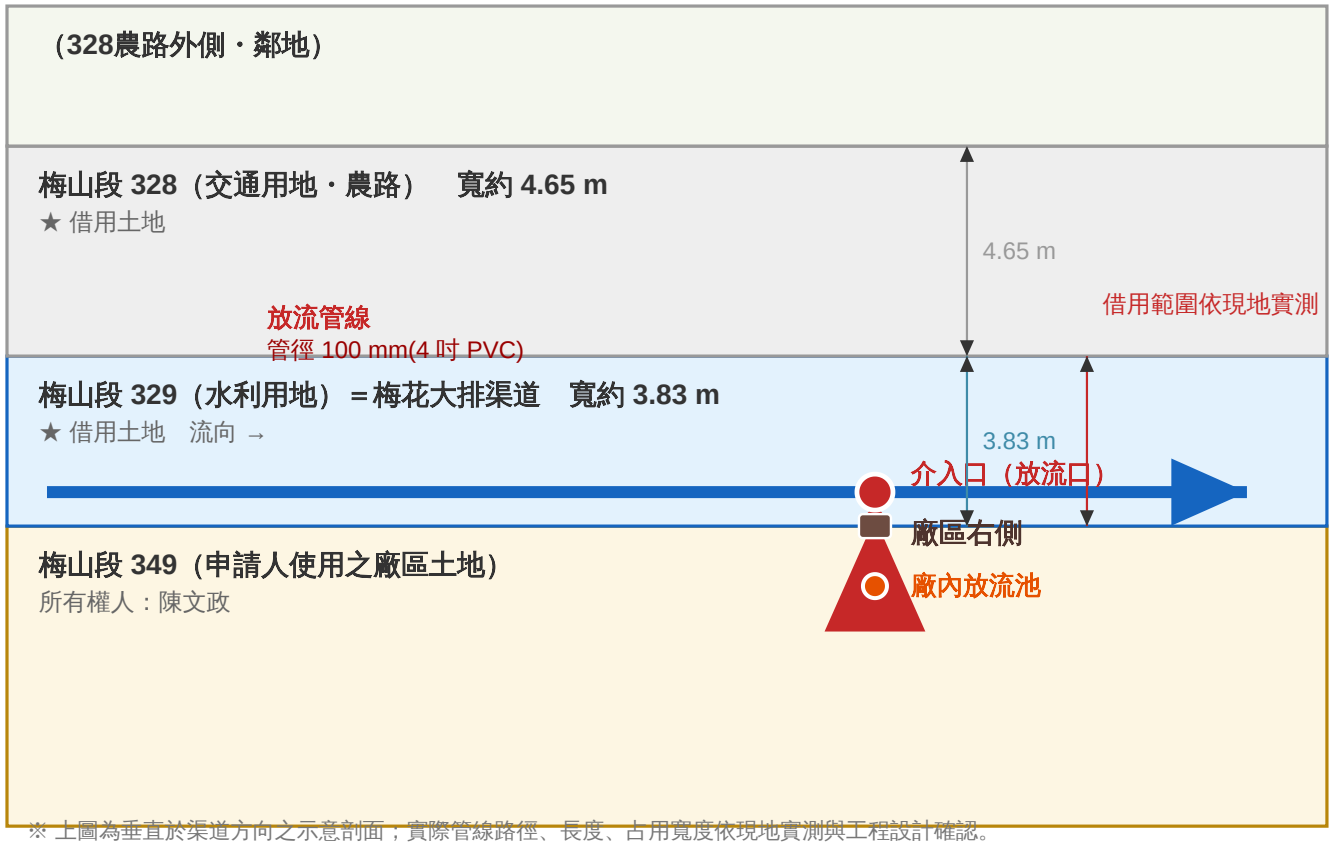

※ 上圖為垂直於渠道方向之示意剖面；實際管線路徑、長度、占用寬度依現地實測與工程設計確認。

鄰接公有土地明細

地號	用地類別	通過長度	面積
梅山段329	水利用地	約 3.83 m	2,090.9㎡
梅山段328	交通用地	—	5,123.8㎡

占用寬度：以管徑計（約 0.1 m）
埋設深度：約 0.3～0.6 m(依現場)
施設方式：■ 埋管　☐ 附掛　☐ 明溝銜接
兩筆土地均為公有性質用地。依官方應檢附文件三，需使用之土地如已依農田水利法第23條第1項納入農田水利事業作業基金者，得免附土地使用同意證明；權屬請調謄本並洽羅東工作站確認。

施設承諾

1. 管線施設不妨礙農路通行及渠道通水。
2. 施工前 7 日通知管理處及羅東工作站，會同放樣後始得施工。
3. 路面及護岸開挖後即時復舊，回復原狀。
4. 損壞農田水利設施或農路者，由本公司負責無條件修復或賠償。
5. 許可期間屆滿或廢止時，自費拆除管線並回復原狀。

介入口坐標（TWD97）

E　325727.90
N　2726851.58
椿號：依初勘實測為準


圖四　借用他人土地管線位置圖說

管線通過梅山段329地號（梅花大排渠道）

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（尺寸待實測）　|　TWD97 二度分帶　|　第 4 張，

註：本圖為官方應檢附文件「借用他人土地者，應含設置於其土地管線位置圖說」之圖說。實際借用範圍、長度及是否須另取得土地使用同意，依地籍謄本權屬及管理處初核結果為準。

圖五　排水系統流路圖

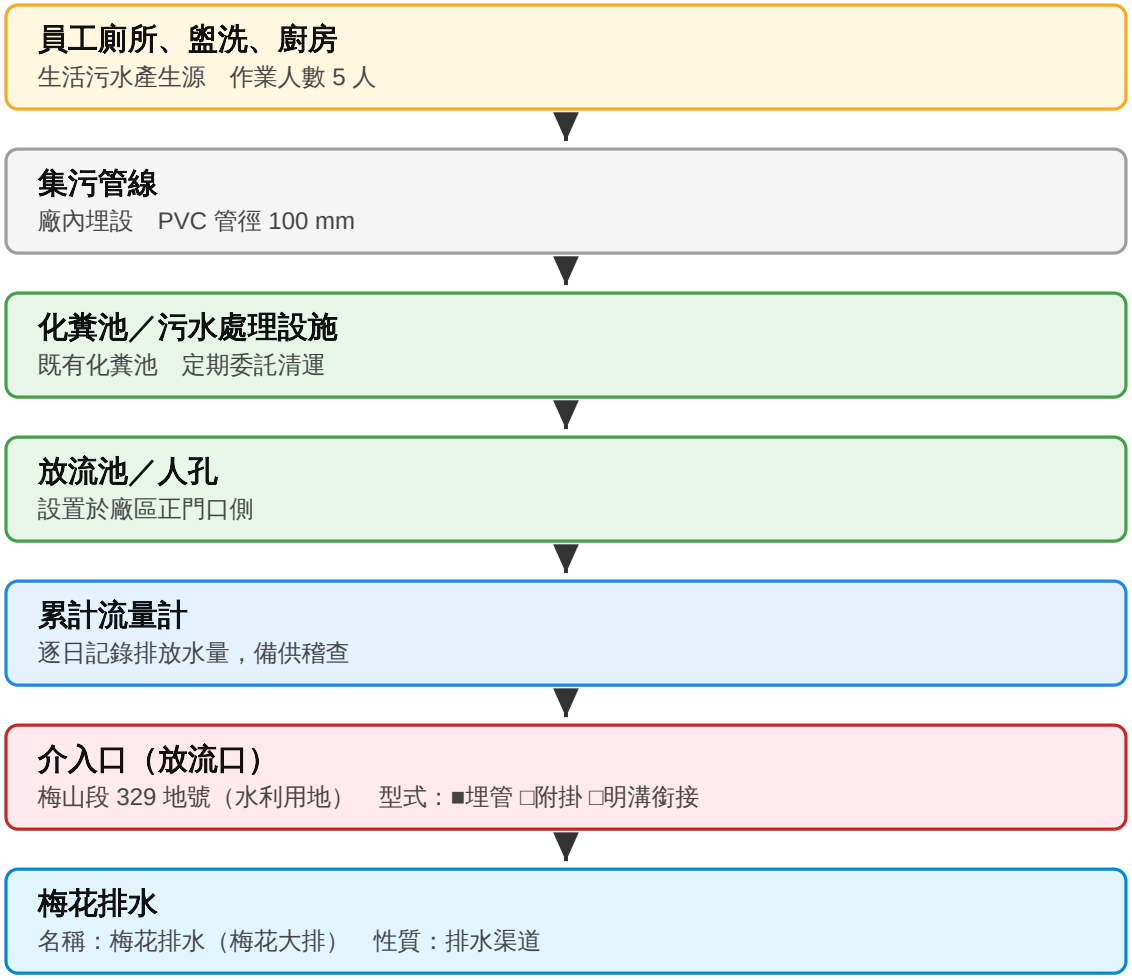

排放水量

作業人數	5 人
單位污水量	150 公升／人·日
日平均排放量	**0.75 m³**
尖峰係數	3.0
日最大排放量	**2.25 m³**
年搭排日數	365 日
年最大排放量	**821.25 m³**

計算依據

內政部「建築物污水處理設施設計技術規範」
表2-1　C-1 工廠（廠房）類
單位污水量 150 公升／人·日
（規範得按作業人數1/4計，本案不折減，
以全員5人計算，屬保守估計）

排放水性質

僅生活污水（廁所、盥洗、廚房）
無製程廢水：木材裁切、刨光、砂磨、
組裝、乾燥等乾式加工，製程不產生廢水
納管申請書已聲明：屬低污染行業別，
製程不含脫脂、酸洗、電鍍或陽極處理
（納管編號 P0200190）


註：管線位置及高程依縣府、農田水利署會同放樣確認。

圖五　排水系統流路圖
生活污水自產生源至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排示意圖（無比例）　|　TWD97 二度分帶　|　第 5 張，共 6


圖六　介入口工程設計圖（平面・剖面）

（一）平面圖

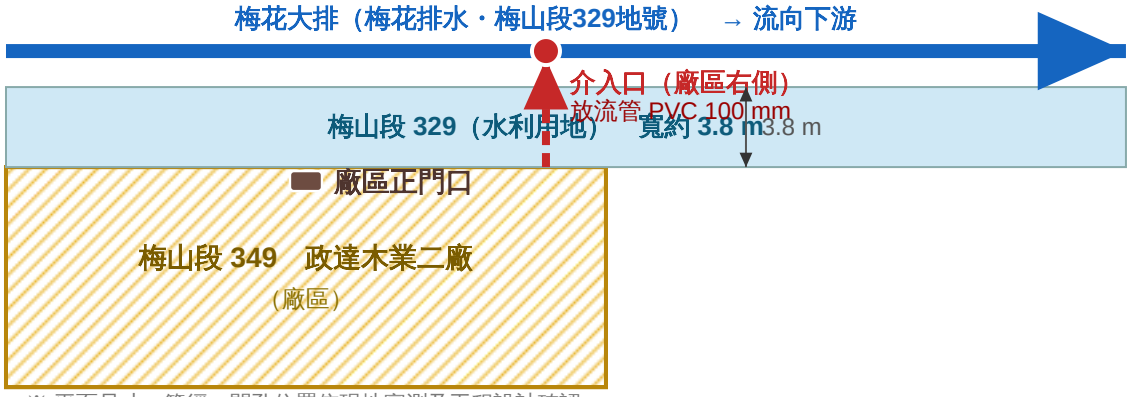

※ 平面尺寸、管徑、開孔位置依現地實測及工程設計確認

（二）縱剖面圖

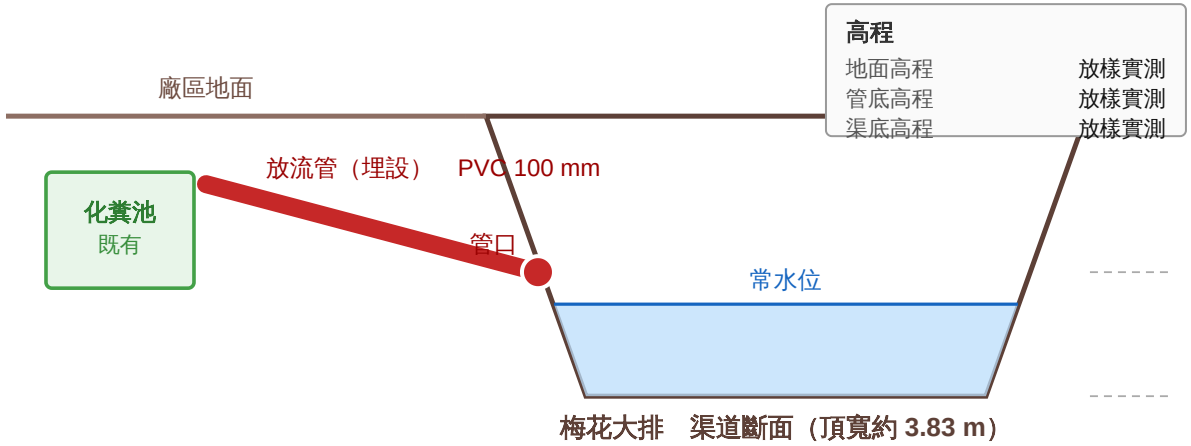

※ 高程、管徑、渠道斷面尺寸依現地實測填寫；施工前7日通知管理處及工作站會同放樣。

介入口規格

介入口型式	■ 埋管　□ 附掛　□ 明溝銜接
管材	PVC
管徑	100 mm(4 吋)
管底高程	放樣實測
渠道底高程	放樣實測
渠道斷面（寬×深）	頂寬約 3.83 m
護岸開孔尺寸	約 φ15 cm
回填與復舊方式	砂回填、原狀復舊
施工廠商	核准後選定報府

施工承諾事項

1. 施工前 7 日通知管理處及羅東工作站，會同放樣後始得施工。
2. 施工期間不阻斷渠道通水，必要時設置臨時導水設施。
3. 施工損壞農田水利設施者，由本公司負責無條件修復或賠償。
4. 竣工後 30 日內報請管理處查驗。
5. 避開灌溉期施工；如須於灌溉期施工，事先報經管理處同意。
6. 工程費用由本公司負擔。


圖六　介入口工程設計圖

平面圖・縱剖面圖

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（尺寸待實測）　|　TWD97 二度分帶　|　第 6 張，


圖七　既設版橋平面圖・縱剖面圖

(一)平面圖

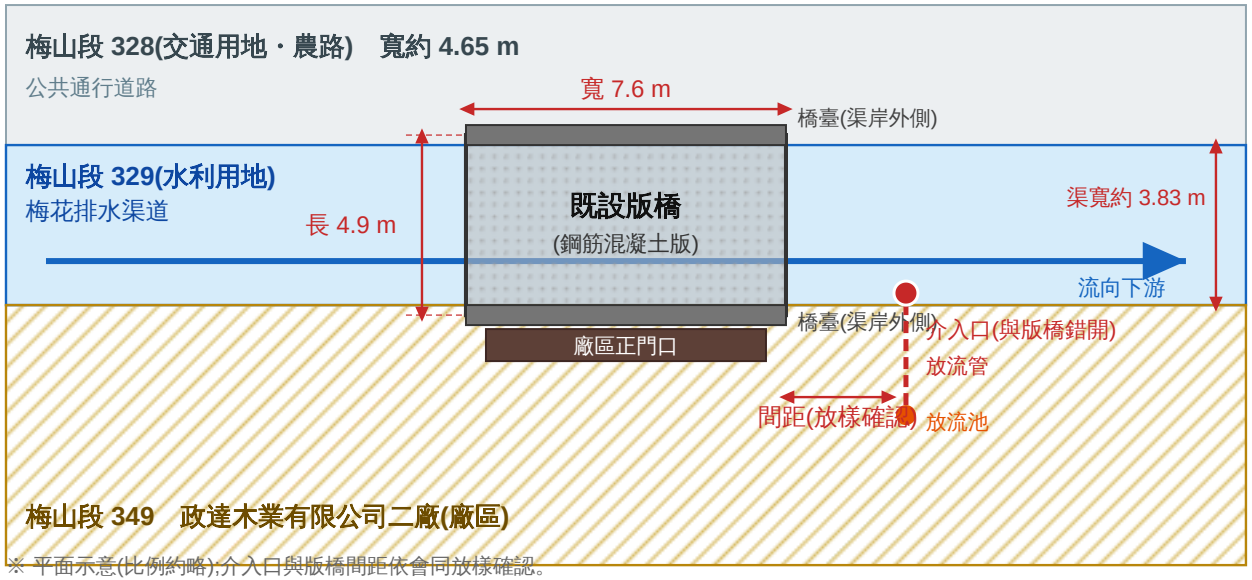

※ 平面示意(比例約略);介入口與版橋間距依會同放樣確認。

(二)縱剖面圖(沿版橋中心線,垂直渠道方向)

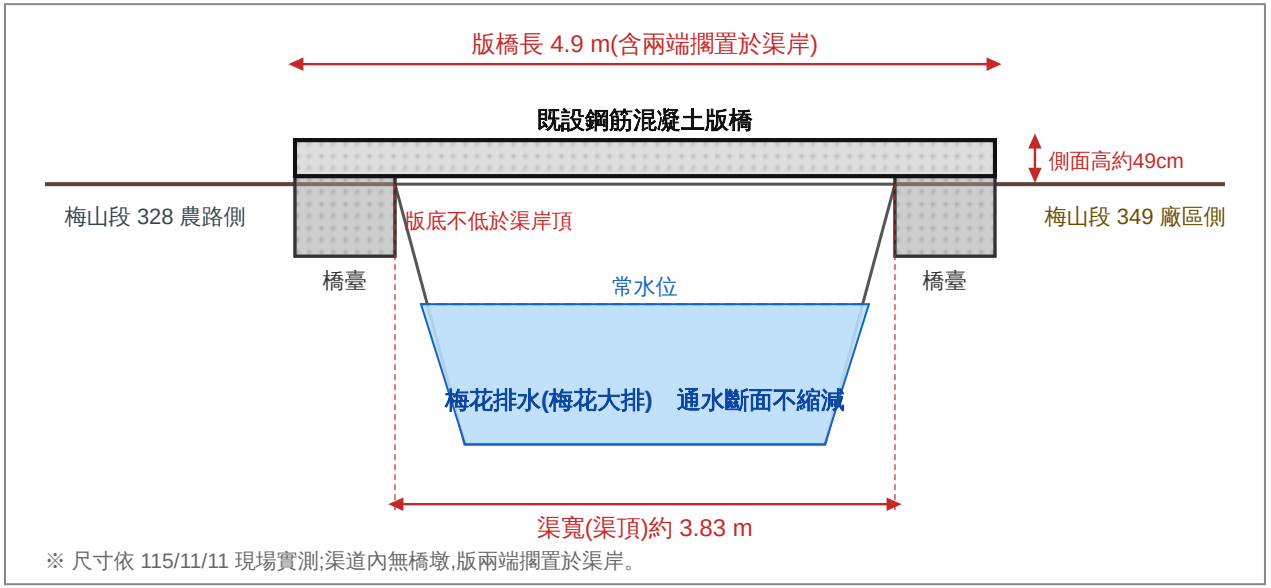

※ 尺寸依 115/11/11 現場實測;渠道內無橋墩,版兩端擱置於渠岸。

既設版橋規格(現況)

位　　置	廠區正門口,梅山段329地號
跨越水路	梅花排水(宜蘭縣管區域排水)
連　　接	梅山段328農路 ↔ 349廠區
現　　況	已施設完成(補辦申請)
型　　式	鋼筋混凝土版橋
長　　度	4.9 m(跨越渠道方向,渠寬約 3.83 m)
寬　　度	7.6 m(面積約 37.24 m²)
版側高度	約 49 cm(照片判讀)
橋臺位置	渠岸外側,渠內無橋墩
用　　途	廠區人員及車輛出入通行
數　　量	一處一座
施設年份	不詳(既設多年,依現況補辦)

設置原則與承諾事項

1. 版橋長 4.9 m,在 6 m 以內,一處一座。
2. 渠道內不設橋墩,橋臺設於渠岸外側,不縮減梅花排水通水斷面。
3. 版底不低於渠岸頂,不妨礙排水及渠道維護。
4. 放流管介入口與版橋錯開,不設於橋下。
5. 每年防汛期前及颱風警報前清除橋下淤積、漂流物;災後檢查橋面與橋臺並報府。
6. 維護管理由申請人負責;主管機關認有妨礙河防或通水時,依指示改善或自費拆除。

依據:宜蘭縣政府水利事業(跨越水道)建造物申辦規定;
農業部農田水利署宜蘭管理處版橋規定(長度 6 m 以內、一處一座)。

圖七　既設版橋平面圖・縱剖面圖
跨越梅花排水(梅山段329地號)

案名:政達木業有限公司二廠既設版橋及生活污水搭排示意圖(115/11/11 實測)　|　第 7 張,共 7 張

既設版橋現況照片表(一)

政達木業有限公司二廠 ｜ 廠區正門口跨越梅花排水版橋(梅山段329地號) ｜ 拍攝日期:115年11月11日



1. 廠區正門口全景:版橋連接梅林路與廠區,供廠區人員及車輛出入。



2. 版橋側視(梅林路側):鋼筋混凝土版,渠道內無橋墩,通水斷面未縮減。



3. 版橋側視(另一側):梅花排水為混凝土內面工渠道,版兩端擱置於渠岸。



4. 版側面高度量測(捲尺讀數約 49 cm)。

既設版橋現況照片表(二)

尺寸實測:長 4.9 m(跨越渠道方向)× 寬 7.6 m;版側面高度約 49 cm

 5. 版緣量測。	尺寸:長 4.9 m(跨越渠道方向)× 寬 7.6 m,面積約 37.24 m²;版側面高度約 49 cm。 構造:鋼筋混凝土版橋,兩端擱置於渠岸,渠內無橋墩。 用途:廠區人員及車輛出入通行。
