# 政達木業二廠　生活污水搭排梅花排水介入口工程

# 施工廠商資料填寫單

> 請廠商參考附上的「施工計畫書」與「圖說」，填寫下列資料後交回（拍照或回傳皆可）。 聯絡人：鄭玉屏 0975-328-779　｜　填表日期：115 年　　月　　日

## 一、廠商基本資料

| 項目 | 填寫 |
|---|---|
| 廠商名稱 | |
| 統一編號 | |
| 負責人 | |
| 聯絡電話 | |
| 現場負責人／電話 | |
| 颱風豪雨 24 小時聯絡人／電話 | |

## 二、放流管線

| 項目 | 填寫 | 說明 |
|---|---|---|
| 管材 | ☐PVC　☐其他：＿＿＿ | 建議 PVC 管 |
| 管徑 | ＿＿＿ mm（＿＿ 吋） | 建議 100 mm（4 吋）以上 |
| 管線長度 | 約 ＿＿＿ m | 從廠內放流池到介入口 |
| 埋設深度 | 約 ＿＿＿ m | |
| 坡度 | ＿＿＿ % | 不小於 1% |

## 三、介入口（接入梅花排水處）

| 項目 | 填寫 | 說明 |
|---|---|---|
| 介入口型式 | ☐埋管　☐附掛　☐明溝銜接 | |
| 護岸開孔尺寸 | ＿＿＿ × ＿＿＿ cm | |
| 地面高程 | ＿＿＿ m | |
| 管底高程 | ＿＿＿ m | 需高於渠道常水位 |
| 渠底高程 | ＿＿＿ m | |
| 渠道斷面（寬 × | ＿＿＿ × ＿＿＿ m | 渠頂寬約 3.83 m |

| 項目 | 填寫 | 說明 |
|---|---|---|
| 深） | | |
| 回填與復舊方式 | | |
| 介入口與版橋距離 | 約 ＿＿＿ m | 介入口不可設在版橋下 |

## 四、化糞池與放流池（圖五空格）

| 項目 | 填寫 |
|---|---|
| 化糞池型式 | □傳統化糞池　□預鑄式污水處理槽　□其他：＿＿＿ |
| 有效容積 | ＿＿＿ m³ |
| 清理頻率 | 每 ＿＿＿ 個月 |
| 放流池／人孔位置 | |

## 五、施工時程

| 項目 | 填寫 |
|---|---|
| 預定施工日期 | 115／116 年　　月　　日 ～　　月　　日 |
| 工期 | 約 ＿＿＿ 個工作天 |
| 估價 | 約 ＿＿＿＿＿＿ 元 |

## 六、施工注意事項（請廠商配合）

1. **縣府核准後才能施工**，核准前不得先接管排放。
2. 原則上避開防汛期（5～11 月），以 12 月～隔年 4 月施工為主。
3. 施工前 **7 天** 由本公司通知縣府水利資源處及農田水利署羅東工作站，會同放樣後才開工。
4. 施工期間不能擋住梅花排水通水；土方、殘料不可推入渠道；農路半幅施工保持通行。
5. 護岸開孔用鑽孔或切割，不可重錘破壞，管口周邊用無收縮水泥砂漿封填。
6. 正門口既設版橋不施工；介入口要避開版橋橋臺。
7. 完工後拍攝施工各階段照片（開挖、埋管、開孔、封填、復舊），供竣工查驗用。

**附件：**

1. 施工計畫書（含防汛計畫）
2. 圖說：圖一至圖七、既設版橋現況照片表

# 政達木業有限公司二廠 既設版橋及生活污水搭排梅花排水介入口工程施工計畫書(含防汛計畫)

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 申請人 | 政達木業有限公司二廠(統一編號 89497279) |
| 負責人 | 陳文政 |
| 工廠地址 | 宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路 571-1 號(冬山鄉梅山段 349 地號) |
| 施工地點 | 宜蘭縣冬山鄉梅山段 329 地號(水利用地,梅花排水),廠區正門口前 |
| 承受水體 | 梅花排水(宜蘭縣政府管理之區域排水) |
| 施工廠商 | 【待補:廠商名稱、統編、電話】 |
| 編製日期 | 中華民國 115 年 11 月 【　】 日 |

---

## 壹、工程概要

### 一、工程緣由

本公司二廠工廠改善計畫經宜蘭縣政府 113 年 11 月 22 日府旅商字第 1130980315 號函核定,改善期限經 115 年 8 月 28 日府旅商字第 1150152621 號函准予展延至 116 年 5 月 21 日。廠內生活污水擬經化糞池處理後,以埋設管線排入梅花排水。使用梅山段 329 地號水利用地部分,已經農業部農田水利署 115 年 10 月 28 日農水宜字第 1158104356 號函許可(期間 115 年 9 月 23 日至 119 年 12 月 31 日);依該函說明四,另向宜蘭縣政府申請排放許可,並檢附本施工計畫書。

### 二、工程內容

| 項目 | 內容 | 備註 |
|---|---|---|
| 排放水種類 | 生活污水(廁所、盥洗、廚房),經化糞池處理 | 無製程廢水(木材乾式加工) |
| 排放量 | 每日 2.25 立方公尺,年 365 日,年 821.25 立方公尺 | 依搭排計畫書 |
| 放流管 | 管材【待補】,管徑【待補】mm,長度約【待補】m | 建議 PVC 管 100 mm(4 吋)以上,由施工廠商依設計確認 |
| 管線路徑 | 廠內放流池 → 正門口 → 梅山段 329 地號 → 梅花排水護岸 | 詳圖二、圖四 |
| 介入口型式 | ☐埋管 ☐附掛 ☐明溝銜接【待選】 | 詳圖六 |
| 護岸開孔 | 尺寸【待補】,開孔後以混凝土或無收縮水泥砂漿封填 | 不得降低護岸結構強度 |
| 管口高程 | 管底高程【待補】m,高於渠道常水位 | 避免倒灌 |
| 介入口坐標 | TWD97 E 325727.90、N 2726851.58 | 依會同放樣結果為準 |

### 二之一、既設版橋

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 位置 | 廠區正門口,跨越梅花排水(梅山段 329 地號),連接梅山段 328 地號農路與 349 地號廠區 |
| 現況 | **已施設完成**,本次併案申請補辦許可,不另施工 |
| 尺寸 | 長 4.9 公尺(跨越渠道方向)× 寬 7.6 公尺(約 37.24 平方公尺);版側面高度約 49 公分(115/11/11 實測照片判讀) |
| 構造 | 鋼筋混凝土版橋,兩端擱置於渠岸,渠內無橋墩(115/11/11 現場照片) |
| 用途 | 廠區人員及車輛出入通行 |
| 維護管理 | 由申請人負責;定期清除橋下淤積與雜物,確保不阻礙通水;防汛期前檢查橋面及橋臺 |

> 放流管線介入口位置應避開版橋橋臺,以免影響橋體結構(依會同放樣結果調整)。

### 三、預定工期

自會同放樣完成之翌日起約 **5 個工作天**(不含材料進場與養護等待)。預定施工期間:115 年 【　】 月 【　】 日至 【　】 月 【　】 日,**避開防汛期**(詳肆、防汛計畫)。

---

## 貳、施工組織與聯絡

| 職務 | 姓名 | 電話 | 職責 |
|---|---|---|---|
| 申請人代表 | 陳文政(負責人) | 0932-164882 | 工程總負責、對外協調 |
| 受託聯絡人 | 鄭玉屏 | 0975-328-779 | 申請文件、機關聯繫 |
| 施工廠商負責人 | 【待補】 | 【待補】 | 施工執行、品質與安全 |
| 現場負責人 | 【待補】 | 【待補】 | 每日現場管理,施工期間全程在場 |
| 防汛聯絡人(24 小時) | 【待補】 | 【待補】 | 颱風豪雨期間應變 |

---

## 參、施工方法與步驟

### 一、施工前準備

1. 取得宜蘭縣政府排放許可(排水許可證明)後始得施工。
2. 施工前 **7 日** 以書面通知宜蘭縣政府水利資源處及農業部農田水利署宜蘭管理處羅東工作站,會同現場放樣,確認介入口位置、樁號、高程與管線路徑。
3. 查詢地下管線(自來水、電力、電信)位置,避免挖損。
4. 現場設置施工告示牌(載明工程名稱、許可文號、施工期間、施工廠商及聯絡電話)及安全圍籬、警示燈。
5. 備妥防汛器材(詳肆、三)。

### 二、施工步驟

| 步驟 | 工作內容 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 1 放樣 | 會同機關人員放樣,標示管線中心線、介入口位置及開挖範圍 | 拍照留存 |
| 2 開挖 | 以小型機具或人工開挖管溝,深度【待補】m,寬度以管徑加兩側各 20 cm 為原則 | 開挖土方堆置於渠道外側,不得推入渠道 |
| 3 管線埋設 | 管溝底鋪砂墊層約 10 cm,依設計坡度(不小於 1%)埋設放流管,接頭密封 | 通水試驗確認無滲漏 |
| 4 護岸開孔與介入口 | 於梅花排水護岸依設計尺寸開孔,置入管口,管口與護岸面齊平或依圖六施作,周邊以無收縮水泥砂漿封填 | 開孔採鑽孔或切割,不得以重錘破壞護岸;管口不得突出妨礙通水 |
| 5 回填 | 以砂或原土分層回填夯實,每層不超過 30 cm | 回填高程與原地面齊平 |
| 6 復舊 | 農路(梅山段 328)路面、護岸及植生依原狀復舊 | 復舊標準不低於原狀 |
| 7 清理 | 清除渠道內施工殘料、土石,拆除臨時設施 | 渠道斷面回復施工前狀態 |
| 8 竣工 | 拍攝竣工照片,報請宜蘭縣政府竣工查驗;並依農田水利署許可函報羅東工作站 | 查驗合格後懸掛許可證明標示牌 |

### 三、渠道通水維持

1. 施工期間**不得阻斷梅花排水通水**;護岸開孔作業時段選擇低水位時施作。
2. 如須於渠道內作業,以沙包圍堰局部隔離作業區,保留足夠通水斷面,作業完成當日拆除。
3. 每日收工前檢查渠道內無土石、材料殘留。

---

## 肆、防汛計畫

### 一、施工時段

1. 宜蘭地區颱風及豪雨主要發生於每年 5 月至 11 月,本工程**以 12 月至翌年 4 月施工為原則**;如因許可時程須於上述期間施工,應縮短工期並加強應變。
2. 中央氣象署發布本地區豪雨特報、海上或陸上颱風警報時,不得進行護岸開孔及渠道內作業。

### 二、監測與預警

1. 現場負責人每日上工前查詢中央氣象署天氣預報及水利署防災資訊,並留意梅花排水水位。
2. 渠道水位明顯上漲或上游降雨增大時,立即停止渠道內作業,人員機具撤離至安全處所。

### 三、防汛器材(施工期間置於現場)

| 器材 | 數量 | 用途 |
|---|---|---|
| 沙包 | 30 包以上 | 開孔處臨時封堵、防止倒灌 |
| 抽水機 | 1 台 | 管溝及作業區積水抽排 |
| 帆布 / 防水布 | 2 張 | 覆蓋開挖面及堆置土方 |
| 照明燈具、警示燈 | 各 2 組 | 夜間警示 |

| 器材 | 數量 | 用途 |
|---|---|---|
| 救生圈、救生繩 | 各 1 組 | 人員落水救援 |

### 三之一、既設版橋防汛

1. 每年 5 月防汛期前及颱風警報發布前,清除版橋橋下淤積、漂流物及雜物,確保通水斷面。
2. 颱風豪雨過後檢查橋面、橋臺有無沖刷、裂損,發現異狀即通報宜蘭縣政府水利資源處並修復。

### 四、颱風豪雨應變程序

1. **警報發布前(預報期間)**:暫停施工;開挖管溝回填或覆蓋;護岸已開孔未封填者,以沙包及防水布臨時封堵;清除渠道內材料、土石及臨時設施;機具移至渠道及農路以外高處。
2. **警報期間**:禁止人員進入渠道及護岸範圍;防汛聯絡人 24 小時待命。
3. **警報解除後**:檢查護岸、管線、農路及臨時設施有無損壞,發現損壞立即通報宜蘭縣政府水利資源處及羅東工作站並修復;確認安全後始得復工。

### 五、緊急聯絡

| 單位 | 電話 |
|---|---|
| 宜蘭縣政府水利資源處水利行政科 | (03)925-1000 分機 8152 |
| 農業部農田水利署宜蘭管理處羅東工作站 | 【待補】 |
| 農田水利署宜蘭管理處(承辦陳駿毅) | (03)925-5000 分機 257 |
| 冬山鄉公所 | 【待補】 |
| 消防、救護 | 119 |
| 警察 | 110 |

---

## 伍、交通維持與環境保護

1. 梅山段 328 地號農路開挖時,**採半幅施工,保持單線通行**,設置警示燈、交通錐及告示;夜間不留開挖面,無法回填時以鋼板覆蓋並設警示燈。
2. 施工產生之土方、廢棄物當日清運,不得棄置於渠道、農路或鄰地。
3. 施工泥水不得直接排入梅花排水;灑水抑制揚塵。
4. 施工時間為上午 8 時至下午 5 時,避免夜間噪音。
5. 施工期間不得影響鄰近 A7-1 小給(灌溉渠道)之通水,且**放流管不得接入灌溉渠道**。

---

## 陸、職業安全衛生

1. 施工人員應配戴安全帽、反光背心;渠道邊作業應穿著救生衣。
2. 開挖深度超過 1.5 m 時應設擋土支撐或放坡。
3. 機具操作人員應具相關資格;施工前辦理安全宣導。

4. 發生事故時立即停工、救護並通報。

---

## 柒、品質管理與竣工查驗

1. 管材進場檢查規格(管材、管徑、厚度)並留存出貨證明。
2. 管線埋設完成回填前,拍照記錄管徑、坡度、埋設深度,並做通水試驗。
3. 護岸開孔前後、封填完成、復舊完成各階段拍照(含日期)。
4. 竣工後檢附竣工圖、施工照片、材料證明,報請宜蘭縣政府竣工查驗;依農田水利署許可函,同時報羅東工作站。
5. 查驗合格後於介入口附近懸掛排水許可證明標示牌,並報府備查。

---

## 捌、施工承諾事項

1. 施工前 7 日通知宜蘭縣政府及農田水利署宜蘭管理處羅東工作站,會同放樣後始得施工。
2. 施工期間不阻斷渠道通水,必要時設置臨時導水設施。
3. 施工損壞水利設施、護岸或農路者,由本公司負責無條件修復或賠償。
4. 工程費用由本公司負擔。
5. 許可期間屆滿或經廢止時,由本公司自費拆除管線並回復原狀。
6. 遵守主管機關現勘及審查意見,並依指示改善。

---

## 附件

- 圖一 位置圖(廣域)
- 圖二 介入點位置圖(平面圖)
- 圖三 地籍圖套繪圖
- 圖四 借用他人土地管線位置圖說
- 圖五 排水系統流路圖
- 圖六 介入口工程設計圖

申請人:政達木業有限公司二廠　　負責人:陳文政　(蓋公司大小章)

施工廠商:【待補】　　負責人:【待補】　(蓋章)

# 圖一　位置圖（廣域）

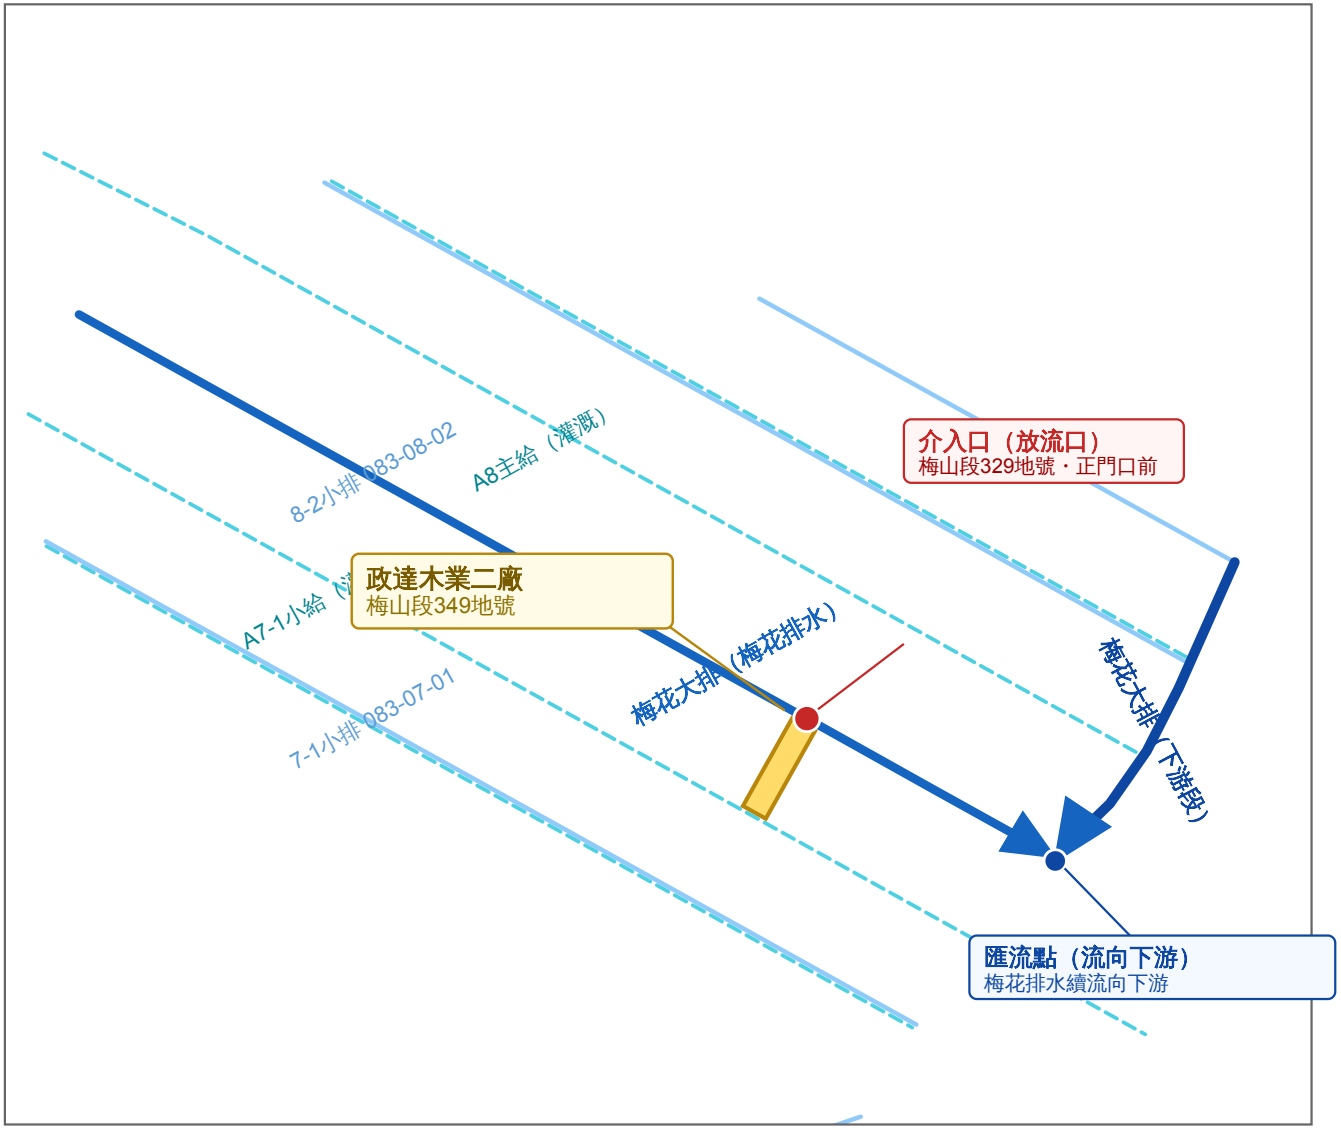



**圖　例**

- 政達木業二廠（梅山段349）
- 梅花大排（本次介入）
- 梅花大排下游段
- 其他排水渠道
- 灌溉渠道（不得排入）
- 介入口（放流口）
- 匯流點

**放流口至承受水體流路**

- ● 廠內化糞池／放流池（梅山段349）
- ▼ 介入口（梅山段329　水利用地）
- ▼ 梅花排水（梅山段329地號）
- ▼ 流向東南下游
- ▼ （宜蘭縣政府轄管區域排水）
- ▼ 梅花排水（圖外下游）

**重要提醒**

廠區西南側 4.1 公尺處為 A7-1小給，性質為「灌溉渠道」。依農田水利法第14條第1項，灌溉專用渠道原則禁止排放非農田排水，本案放流口不得設於該渠道，須由東北側接入梅花排水。

**比例尺　約 1：7019（A4 橫向）**

0　100　200　300　400　公尺

N


底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處「農田水利渠道查詢系統」渠道圖層（Canal民眾查詢1140917）
查詢日期 115.08.28　座標系統 TWD97 二度分帶（EPSG:3826）
註：渠道線形為圖資，僅供位置參考；實際位置及流向依現地與管理處初勘為準。

**圖一　位置圖（廣域）**

廠區位置與排水系統，放流口至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
｜　TWD97 二度分帶　｜　第 1 張，共 6 張

# 圖二　介入點位置圖（平面圖）

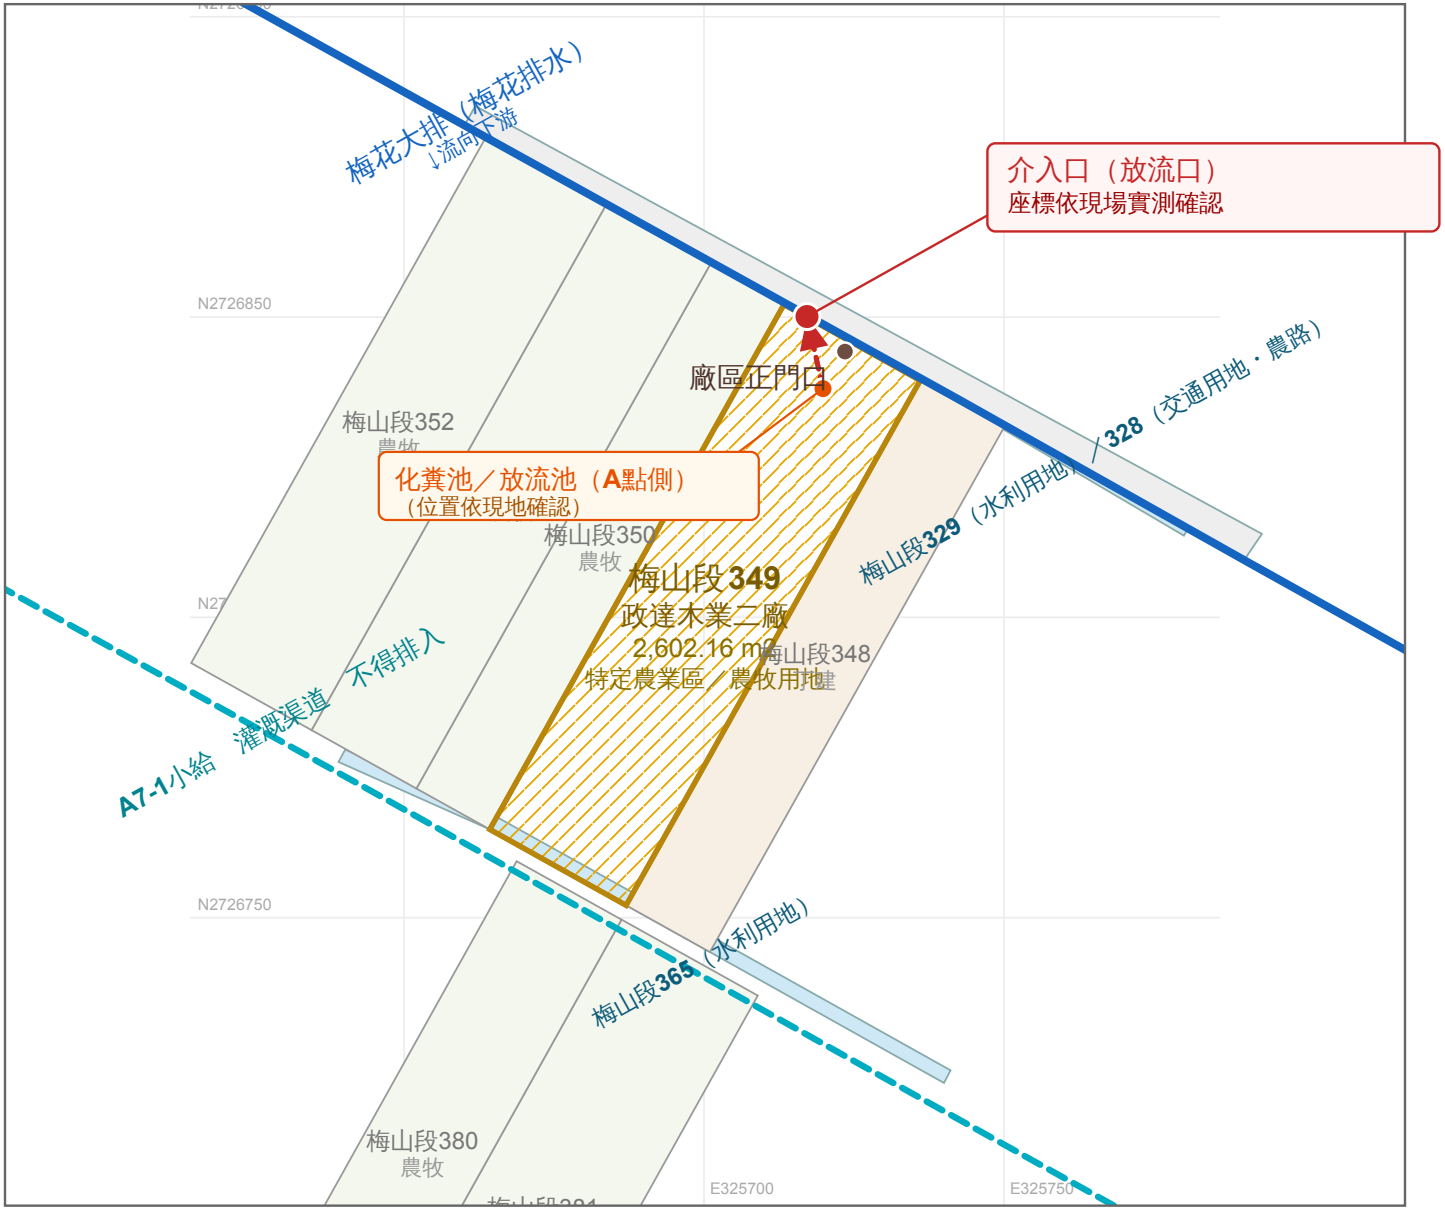


比例尺　約**1**：**1260**（**A4** 向）

0　20　40　60　80　公尺

N

底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處「農田水利渠道查詢系統」
地籍圖層114Oct地籍圖／渠道圖層Canal民眾查詢1140917　查詢日期115.08.28
註：渠道中心線為圖資線形，與現地略有偏差；介入口位置、椿號、坐標及渠道斷面依初勘實測為準。

## 圖　例

- 申請搭排土地（梅山段349）
- 水利用地（329／365）
- 交通用地（328　農路）
- 農牧用地
- 丁種建築用地
- 排水渠道　梅花大排（可搭排）
- 灌溉渠道　A7-1小給（禁止排入）
- 擬設放流管線
- 介入口（放流口）
- 化糞池／放流池

介入渠道：梅花排水（梅花大排）

## 放流口至承受水體流路

- ●廠內化糞池／放流池
- ▼介入口（梅山段329地號）
- ▼梅花排水（本次介入承受水體）
- ▼流向下游（宜蘭縣政府轄管區域排水）
- ▼梅花排水（承受水體）

## 案件資


| | |
|---|---|
| 申請人 | 政達木業有限公司二廠 |
| 負責人 | 陳文政 |
| 廠　址 | 冬山鄉得安村梅林路571-1號 |
| 納管編號 | P0200190 |
| 排放水量 | 日最大2.25 m³／年最大821.25 m³ |

## 圖二　介入點位置圖（平面圖）

含放流口位置至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
｜　TWD97 二度分帶　｜　第2張，共6張

# 圖三　地籍圖套繪圖

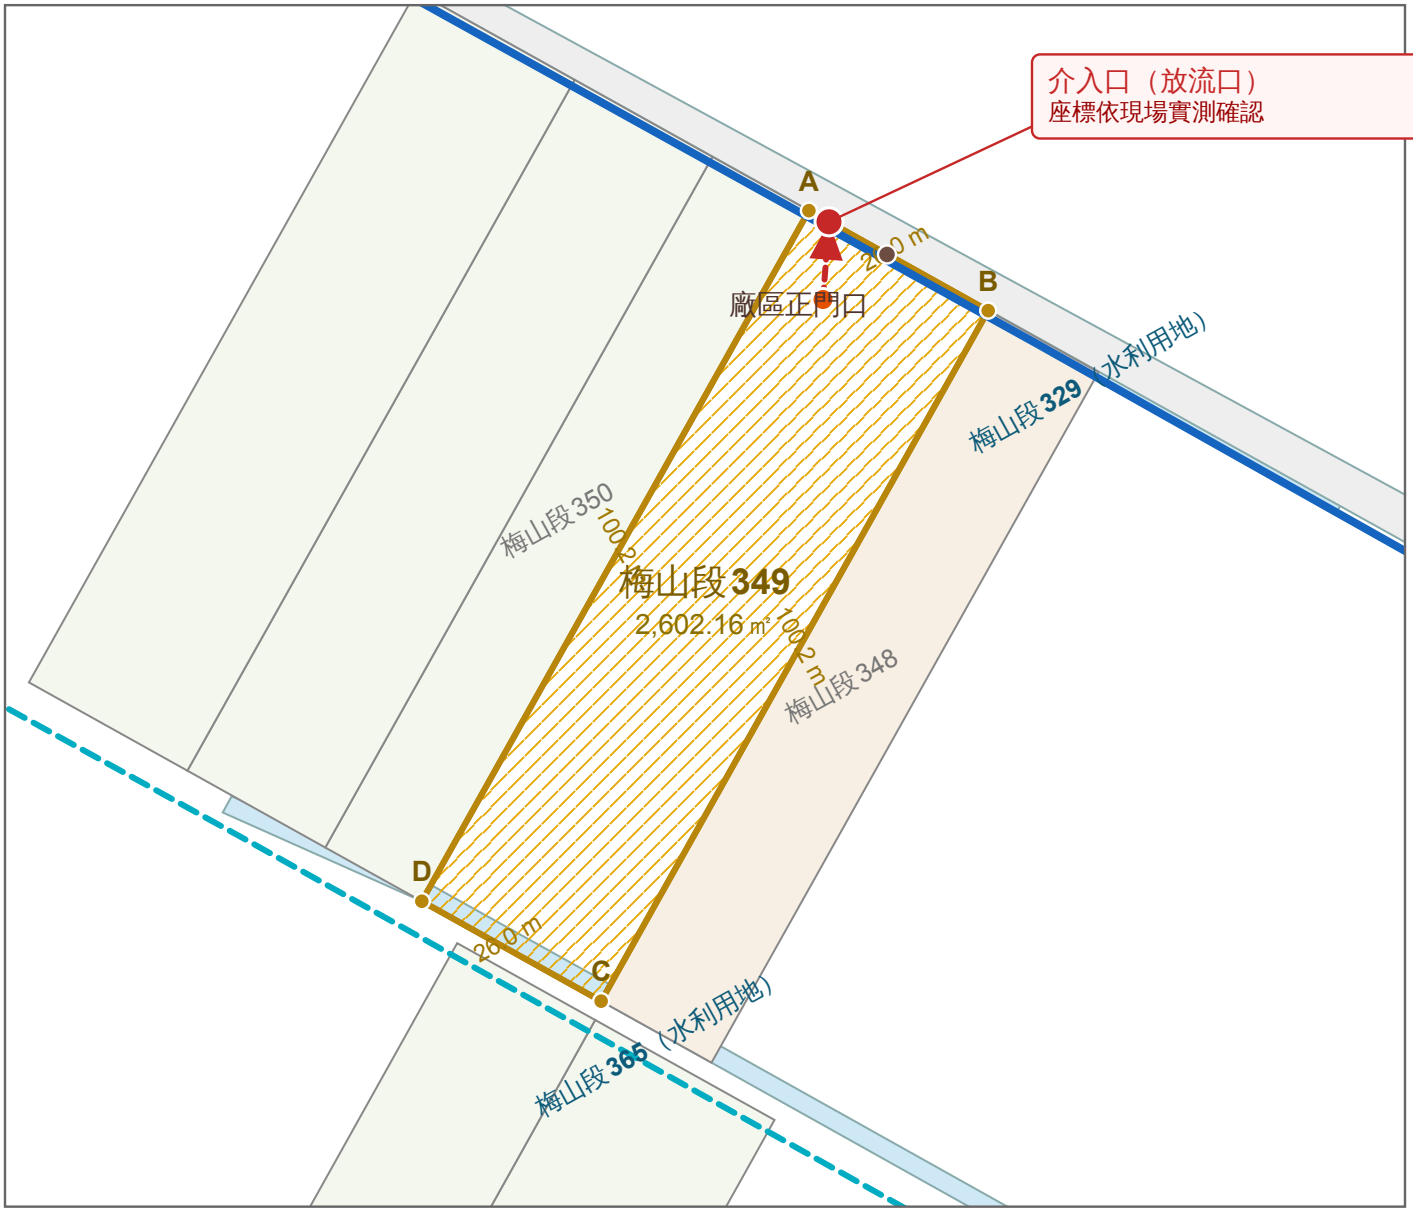


## 界址點坐標（TWD97 二度分帶）

| 點號 | E（m） | N（m） |
|---|---|---|
| A | 325713.33 | 2726852.09 |
| B | 325736.04 | 2726839.44 |
| C | 325687.01 | 2726752.07 |
| D | 325664.29 | 2726764.71 |

介入口　依現場實測　　確認

坐標為圖資推估值，界址以複丈鑑界結果為準。
介入口位置依管理處初勘確認。

## 土地標示

| | |
|---|---|
| 地　號 | 宜蘭縣冬山鄉梅山段349地號 |
| 重測前 | 梅花段1708-0000 |
| 面　積 | 2,602.16平方公尺 |
| 使用分區 | 特定農業區 |
| 用地類別 | 農牧用地 |
| 所有權人 | 陳文政（全部1分之1） |
| 謄本字號 | 羅東謄字第014081號 |
| 核發日期 | 民國115年8月28日 |

## 地號

東北：梅山段329（水利用地）←介入口
西南：梅山段365（水利用地）
東南：梅山段348（丁種建築用地）
西北：梅山段350（農牧用地）

比例尺　約**1**：**958**（**A4** 向）

0　10　20　30　40　公尺

N


底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處渠道查詢系統地籍圖層（114Oct地籍圖）；地籍圖謄本：宜蘭縣羅東地政事務所羅東謄字第014081號（115.08.28，1/500）。
註：本圖為套繪示意，界址以複丈鑑界結果為準；正式送件請於地籍圖謄本正本上套繪搭排位置並簽章。

## 圖三　地籍圖套繪圖

搭排位置套繪於地籍圖

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
｜　TWD97 二度分帶　｜　第3張，共6張

# 圖四　借用他人土地　管線位置圖說

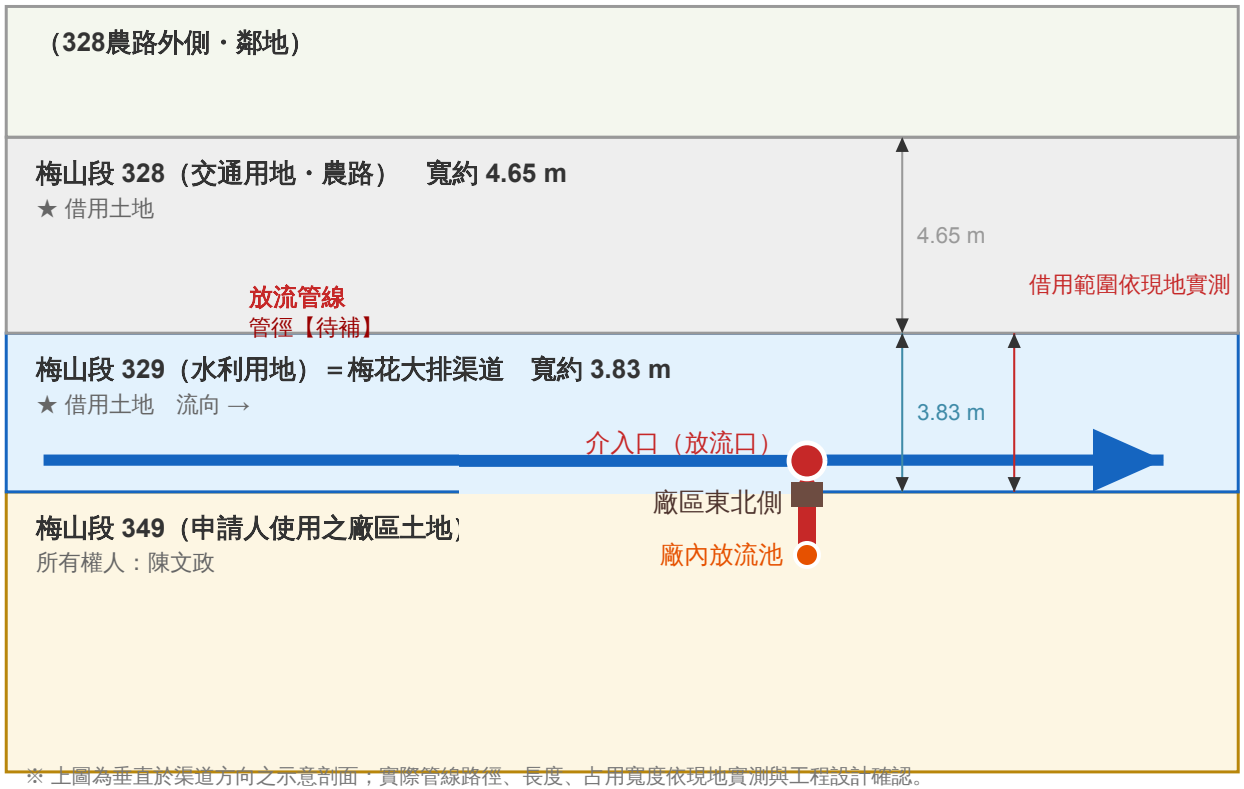


※ 上圖為垂直於渠道方向之示意剖面；實際管線路徑、長度、占用寬度依現地實測與工程設計確認。

## 鄰接公有土地明細

| 地號 | 用地類別 | 通過長度 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 梅山段329 | 水利用地 | 約 3.83 m | 2,090.9㎡ |
| 梅山段328 | 交通用地 | — | 5,123.8㎡ |

占用寬度：以管徑計（【待補】）
埋設深度：【待補】 m
施設方式：☐ 埋管　☐ 附掛　☐ 明溝銜接
兩筆土地均為公有性質用地。依官方應檢附文件三，需使用之土地如已依農田水利法第23條第1項納入農田水利事業作業基金者，得免附土地使用同意證明；權屬請調謄本並洽羅東工作站確認。

## 施設承諾

1. 管線施設不妨礙農路通行及渠道通水。
2. 施工前 7 日通知管理處及羅東工作站，會同放樣後始得施工。
3. 路面及護岸開挖後即時復舊，回復原狀。
4. 損壞農田水利設施或農路者，由本公司負責無條件修復或賠償。
5. 許可期間屆滿或廢止時，自費拆除管線並回復原狀。

## 介入口坐標（TWD97）


E　325727.90
N　2726851.58
椿號：依初勘實測為準

**圖四　借用他人土地管線位置圖說**
管線通過梅山段329地號（梅花大排渠道）

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（尺寸待實測）　|　TWD97 二度分帶　|　第 4 張，

註：本圖為官方應檢附文件「借用他人土地者，應含設置於其土地管線位置圖說」之圖說。實際借用範圍、長度及是否須另取得土地使用同意，依地籍謄本權屬及管理處初審結果為準。

# 圖五　排水系統流路圖

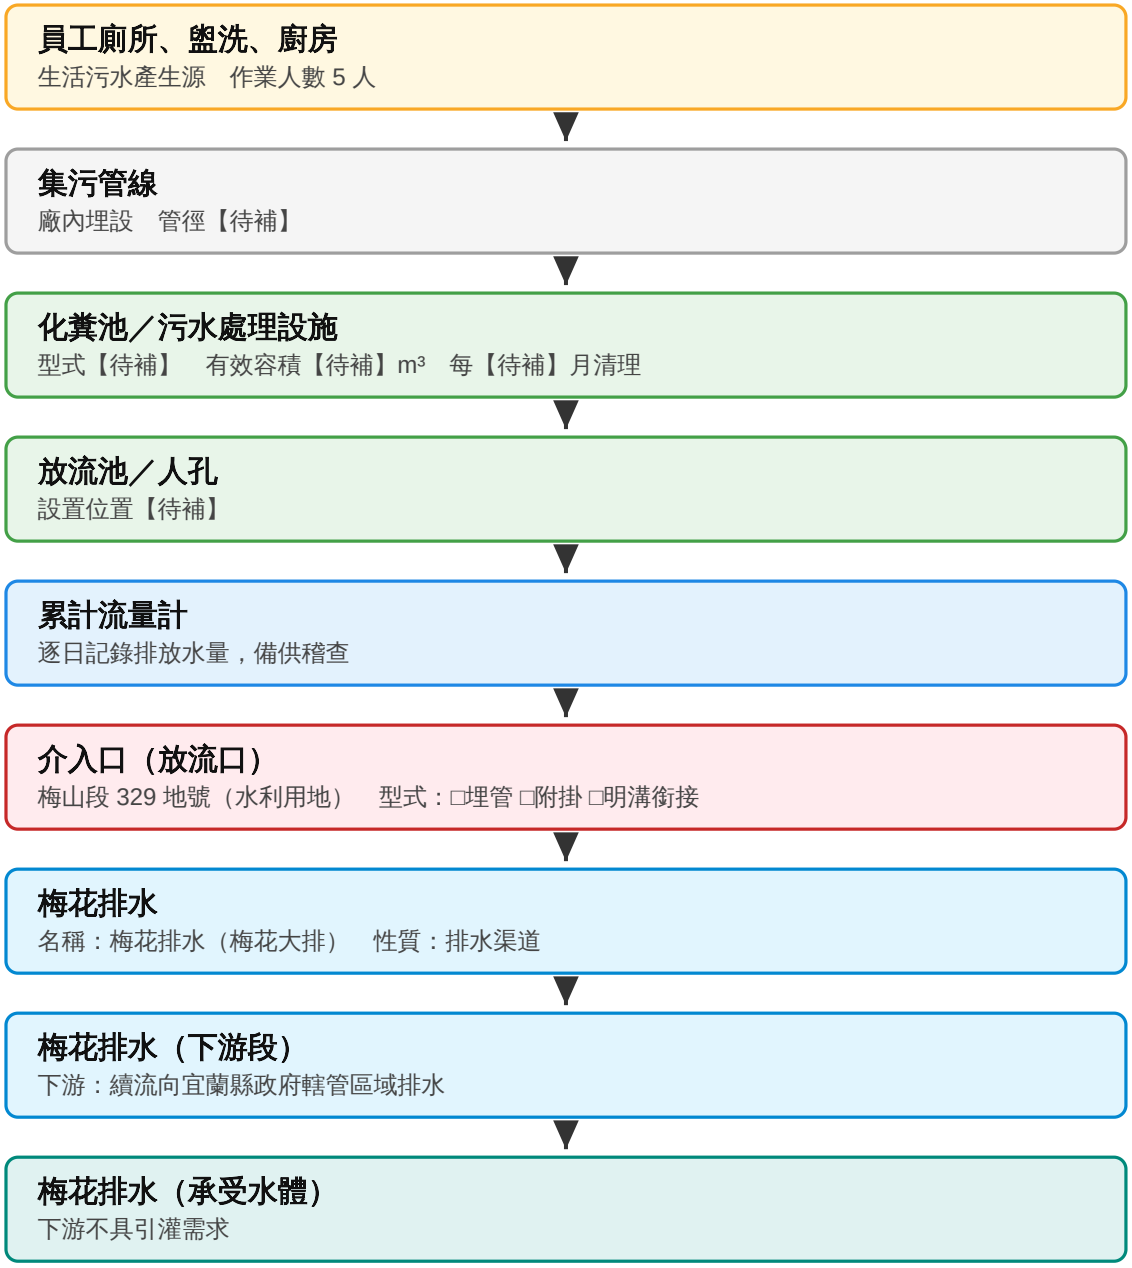


## 排放水量

| | |
|---|---|
| 作業人數 | 5 人 |
| 單位污水量 | 150 公升／人·日 |
| 日平均排放量 | **0.75 m³** |
| 尖峰係數 | 3.0 |
| 日最大排放量 | **2.25 m³** |
| 年搭排日數 | 365 日 |
| 年最大排放量 | **821.25 m³** |

## 計算依據

內政部「建築物污水處理設施設計技術規範」
表2-1　C-1 工廠（廠房）類
單位污水量 150 公升／人·日
（規範得按作業人數1/4計，本案不折減，
以全員5人計算，屬保守估計）

## 排放水性質

僅生活污水（廁所、盥洗、廚房）
無製程廢水：木材裁切、刨光、砂磨、
組裝、乾燥等乾式加工，製程不產生廢水
納管申請書已聲明：屬低污染行業別，
製程不含脫脂、酸洗、電鍍或陽極處理
（納管編號 P0200190）


註：【待補】欄位須依廠內既有污水處理設施現況填寫；介入口型式與管徑依初勘及工程設計確認。

**圖五　排水系統流路圖**
生活污水自產生源至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（無比例）　|　TWD97 二度分帶　|　第 5 張，共 6 張


# 圖六　介入口工程設計圖（平面・剖面）

## （一）平面圖

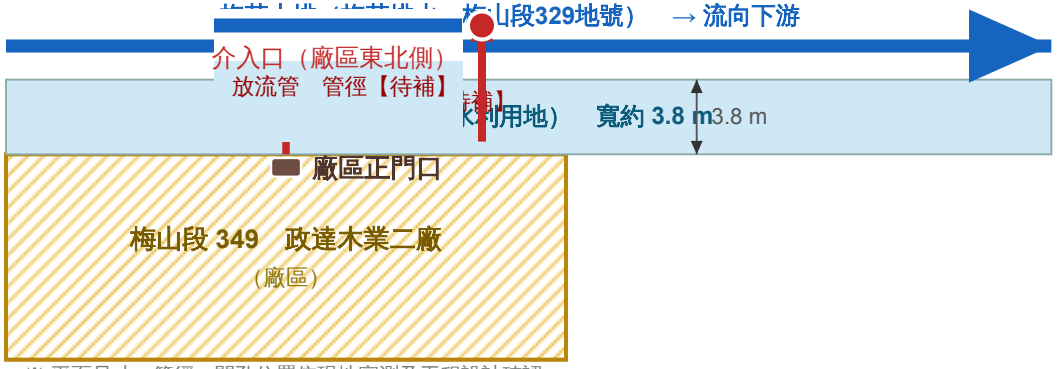


※ 平面尺寸、管徑、開孔位置依現地實測及工程設計確認

## （二）縱剖面圖

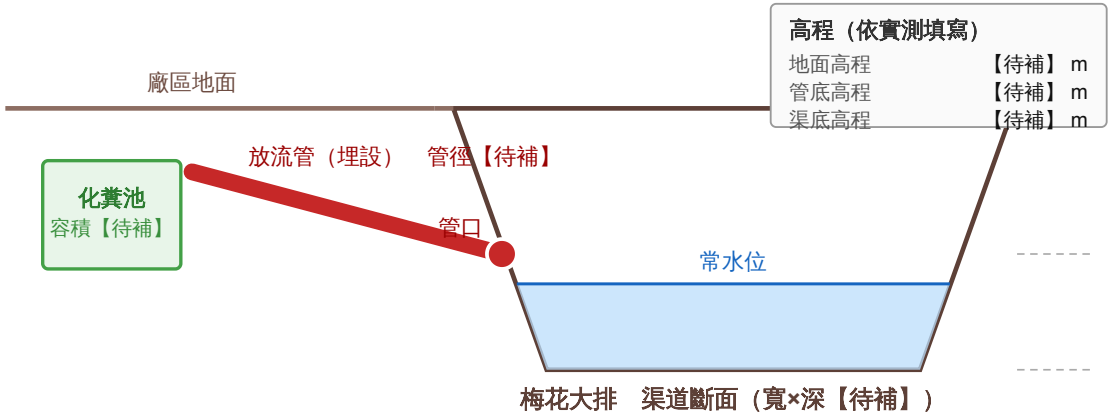


※ 高程、管徑、渠道斷面尺寸依現地實測填寫；施工前7日通知管理處及工作站會同放樣。

### 介入口規格（待填）

| | |
|---|---|
| 介入口型式 | □ 埋管　□ 附掛　□ 明溝銜接 |
| 管材 | 【待補】 |
| 管徑 | 【待補】 mm |
| 管底高程 | 【待補】 m |
| 渠道底高程 | 【待補】 m |
| 渠道斷面（寬×深） | 【待補】 |
| 護岸開孔尺寸 | 【待補】 |
| 回填與復舊方式 | 【待補】 |
| 施工廠商 | 【待補】 |

### 施工承諾事項

1. 施工前 7 日通知管理處及羅東工作站，會同放樣後始得施工。
2. 施工期間不阻斷渠道通水，必要時設置臨時導水設施。
3. 施工損壞農田水利設施者，由本公司負責無條件修復或賠償。
4. 竣工後 30 日內報請管理處查驗。
5. 避開灌溉期施工；如須於灌溉期施工，事先報經管理處同意。
6. 工程費用由本公司負擔。


**圖六　介入口工程設計圖**

平面圖・縱剖面圖

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（尺寸待實測）　|　TWD97 二度分帶　|　第 6 張，


# 圖七　既設版橋平面圖・縱剖面圖

## (一)平面圖

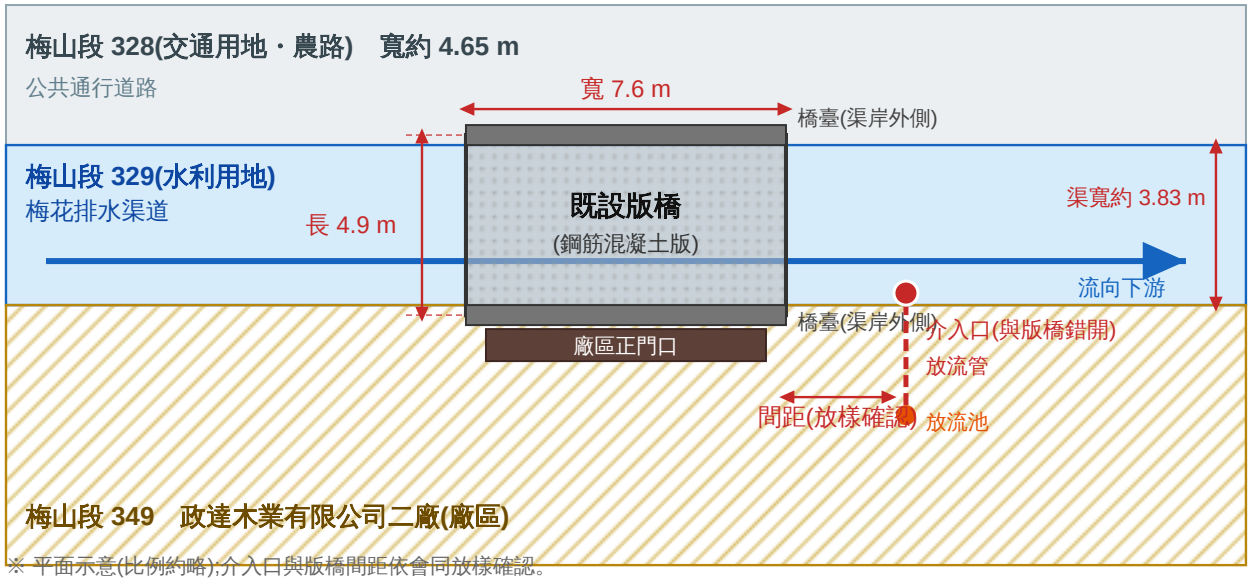


※ 平面示意(比例約略);介入口與版橋間距依會同放樣確認。

## (二)縱剖面圖(沿版橋中心線,垂直渠道方向)

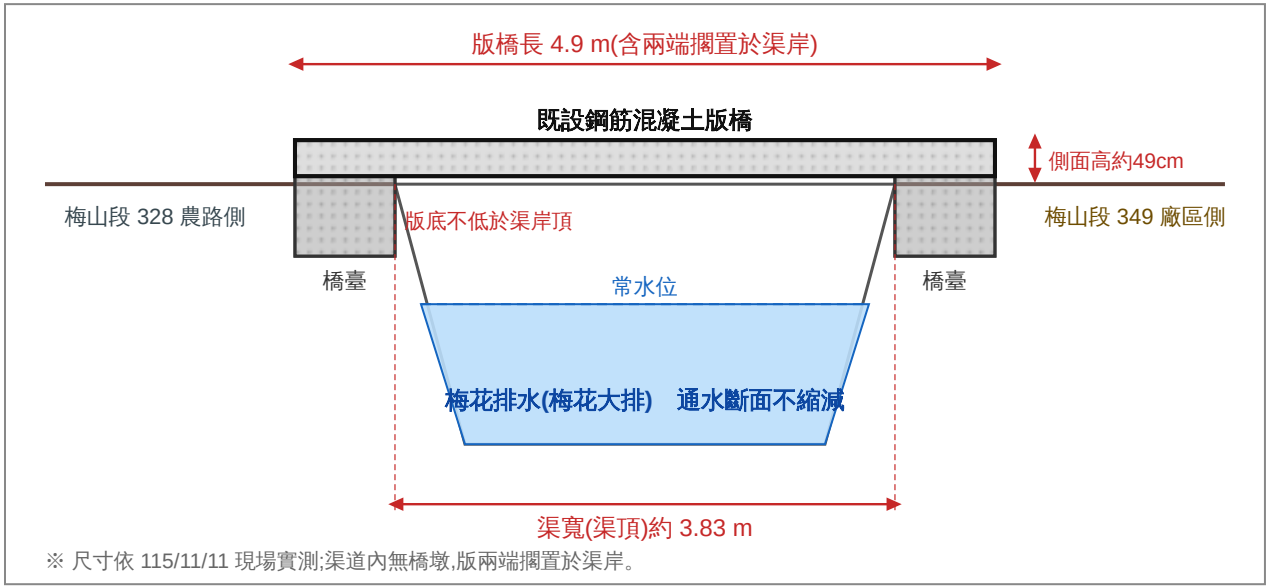


※ 尺寸依 115/11/11 現場實測;渠道內無橋墩,版兩端擱置於渠岸。

### 既設版橋規格(現況)

| | |
|---|---|
| 位　　置 | 廠區正門口,梅山段329地號 |
| 跨越水路 | 梅花排水(宜蘭縣管區域排水) |
| 連　　接 | 梅山段328農路 ↔ 349廠區 |
| 現　　況 | 已施設完成(補辦申請) |
| 型　　式 | 鋼筋混凝土版橋 |
| 長　　度 | 4.9 m(跨越渠道方向,渠寬約 3.83 m) |
| 寬　　度 | 7.6 m(面積約 37.24 m²) |
| 版側高度 | 約 49 cm(照片判讀) |
| 橋臺位置 | 渠岸外側,渠內無橋墩 |
| 用　　途 | 廠區人員及車輛出入通行 |
| 數　　量 | 一處一座 |
| 施設年份 | 不詳(既設多年,依現況補辦) |

### 設置原則與承諾事項

1. 版橋長 4.9 m,在 6 m 以內,一處一座。
2. 渠道內不設橋墩,橋臺設於渠岸外側,不縮減梅花排水通水斷面。
3. 版底不低於渠岸頂,不妨礙排水及渠道維護。
4. 放流管介入口與版橋錯開,不設於橋下。
5. 每年防汛期前及颱風警報前清除橋下淤積、漂流物;災後檢查橋面與橋臺並報府。
6. 維護管理由申請人負責;主管機關認有妨礙河防或通水時,依指示改善或自費拆除。

依據:宜蘭縣政府水利事業(跨越水道)建造物申辦規定;
農業部農田水利署宜蘭管理處版橋規定(長度 6 m 以內、一處一座)。

**圖七　既設版橋平面圖・縱剖面圖**
跨越梅花排水(梅山段329地號)

案名:政達木業有限公司二廠既設版橋及生活污水搭排示意圖(115/11/11 實測)　|　第 7 張,共 7 張

# 既設版橋現況照片表(一)

政達木業有限公司二廠 ｜ 廠區正門口跨越梅花排水版橋(梅山段329地號) ｜ 拍攝日期:115年11月11日



1. 廠區正門口全景:版橋連接梅林路與廠區,供廠區人員及車輛出入。



2. 版橋側視(梅林路側):鋼筋混凝土版,渠道內無橋墩,通水斷面未縮減。



3. 版橋側視(另一側):梅花排水為混凝土內面工渠道,版兩端擱置於渠岸。



4. 版側面高度量測(捲尺讀數約 49 cm)。

# 既設版橋現況照片表(二)

尺寸實測:長 4.9 m(跨越渠道方向)× 寬 7.6 m;版側面高度約 49 cm

| | |
|---|---|
|  <br>5. 版緣量測。 | 尺寸:長 4.9 m(跨越渠道方向)× 寬 7.6 m,面積約 37.24 m²;版側面高度約 49 cm。<br>構造:鋼筋混凝土版橋,兩端擱置於渠岸,渠內無橋墩。<br>用途:廠區人員及車輛出入通行。 |
