宜蘭縣政府

水利事業(跨越水道)建造物

申請書件

申請名稱：　政達木業有限公司二廠既設版橋及生活污水搭排梅花排水申請案

申請單位：　政達木業有限公司二廠

附件	內容
1	書面審查表
2	水利事業(跨越水道)建造物申請書
3	水利事業(跨越水道)建造物使用河川地切結書
4	申請人身分證或公司行號登記證影本(公務機關免附)
5	地理位置示意圖
6	事業計畫書
7	施工計畫書(含防汛計畫書)
8	工程用地套繪(地籍圖及河川圖籍)
9	設計圖說
10	土地登記簿謄本
11	土地使用同意書
12	其他

附件1

書面審査表

【待補】

書面審查表

縣府提供的表單中沒有這張。送件時向水利資源處水利行政科(03-9251000 分機 8152)索取,填好後放在這一頁。

附件2

水利事業(跨越水道)建造物申請書

水利事業(跨越水道)建造物申請書

使用行為名稱	既設版橋(跨越梅花排水)及生活污水搭排(放流管線及介入口設置)
使用內容	一、既設版橋:廠區正門口跨越梅花排水之版橋一座(已施設完成),長約 4 公尺、寬約【　】公尺,供廠區出入通行,補辦申請。二、生活污水搭排:二廠生活污水經化糞池處理後,以放流管埋設通過梅山段 329 地號(水利用地),於梅花排水護岸設置介入口排放;日最大排放量 2.25 立方公尺,年排放量 821.25 立方公尺(年 365 日)。
水道名稱	梅花排水(宜蘭縣管區域排水)
申請人土地	冬山 鄉(鎮)市 梅山 段 － 小段 349 地號
設置位置	冬山 鄉(鎮)市 梅山 段 － 小段 329 地號(廠區正門口前,詳設計圖說)
使用水道面積	版橋約【　】平方公尺(長約 4 公尺×寬【　】公尺);放流管約【　】平方公尺(管徑【　】公尺×通過長度約 3.83 公尺)
預定施工期間	版橋已施設完成(既設);搭排管線於核准後擇期施工,工期約 5 個工作天(避開防汛期,詳施工計畫書)
申請使用期限	自核准之日起至 119 年 12 月 31 日止(配合農業部農田水利署 115 年 10 月 28 日農水宜字第 1158104356 號函許可期間)
經費來源	申請人自籌
備註	本申請案經許可後，爾後有關維護管理工作由申請人負責。

右列使用行為願遵照水利法及河川管理辦法等相關法令，在不妨害河防安全下施設之，茲檢附本申請書、切結書、地理位置示意圖、事業計畫書、施工計畫書(含防汛計畫書)、工程用地套繪(地籍圖或河川圖籍，構造物中心線縱橫座標值)、地形實測圖(原則以透明紙繪製、測繪人應簽名蓋章)、設計圖、水理分析報告(非跨越水道及無縮減河道通水斷面者免附)、土地登記簿謄本(正本至少一份)、土地使用同意書(正本至少一份)，上揭資料以A4大小裝訂成冊一式四份，請准予興辦。

此致

宜蘭縣政府

申請人：政達木業有限公司二廠

代表人：陳文政

住址：宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路571-1號

電話：(03)958-5175

中華民國　　年　　月　　日

附件3

水利事業(跨越水道)建造物使用河川地切結書

水利事業(跨越水道)建造物使用河川地切結書

立切結書人為　政達木業有限公司二廠　需要申請在　冬山鄉(鎮市)　梅山　段　－　小段　329　地號附近　梅花排水(區域排水)　溪(河)河川地施設　既設版橋及生活污水放流管線、介入口　，前開使用行為願依河川管理辦法規定不要求任何補償，且願意依照申請書附送之設計圖及貴府核可函附帶條件辦理，許可使用期滿自行回復原狀，使用期間如因設置或管理欠缺，致人民生命財產受損害，除願遵照指示撤除原設全部建造物外，並負賠償責任，如涉及損害第三者權益，經貴府通知改善或拆除時，立切結人無條件依指示立即處理，且不要求任何補償，如有違背，願負一切法律責任，恐口說無憑特立切結書存據。

此致

宜蘭縣政府

具切結書人：政達木業有限公司二廠

代表人：陳文政

住址：宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路 571-1 號

電話：(03)958-5175

中華民國　　年　　月　　日

附件4

公司行號登記證影本

有限公司變更登記表

（公司印章）　（代表公司負責人印章）

變更時請打V		變更時請打V	
			

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格

變更預查編號	11101362[illegible]
公司統一編號	89497279
公司聯絡電話	039585176
僑外投資事業	□是 V否　一人公司 □是 V否
陸資	□是 V否

原名稱 _____ 有限公司

	一、公司名稱（變更後）	中文	政達木業			有限公司
		（章程所訂）外文				
	二、（郵遞區號）公司所在地（含鄉鎮市區村里）	（ 269 ）宜蘭縣冬山鄉梅林路571號				
	三、資本總額	新台幣				7,000,000 元（阿拉伯數字）
	四、董事人數	1 人	五、代表人姓名	陳文政		
V	六、公司章程修正（訂定）日期	111 年 02 月 24 日				
	七、本次資本增加明細（若資本為7者，請加填第九欄位）	資產增加	1. 現金			0 元
			2. 財產			0 元
			3. 技術			0 元
		權益科目調整	4. 資本公積			0 元
			5. 法定盈餘公積			0 元
			6. 股息及紅利			0 元
		併購	7. 合併			0 元
		其他	8. 債權抵繳股款			0 元
						元
	八、本次資本減少明細	1. 彌補虧損	0 元	2. 退還出資額		0 元
						元

九、被合併公司資料明細	合併基準日	統一編號	公司名稱
	年 月 日		
	年 月 日		

※ 變更登記日期文號 111.3.03 經授中字第 11133126040 號　※ 檔號 [illegible]

公務記載蓋章欄

經濟部中部辦公室 111.3.03 公司登記長 章用章

（一）申請表一式二份，於核辦後一份存核辦單位，一份送還申請公司收執。
（二）為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請採用阿拉伯數字，並請勿折疊、挖補、浮貼或塗改。
（三）※各欄如變更登記日期文號、檔號等，申請人請勿填寫。
（四）違反公司法代作資金導致公司資本不實，公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
（五）為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。

政達木業

有限公司變更登記表

註:欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。

更請V變時打	所營事業		
	編號	代碼	營業項目說明
V	1	C501990	其他木製品製造業
V	2	C501010	製材業
V	3	C501040	組合木材製造業
V	4	C501060	木質容器製造業
V	5	CA02010	金屬結構及建築組件製造業
V	6	F401010	國際貿易業
V	7	F111090	建材批發業
V	8	F211010	建材零售業
V	9	C901060	耐火材料製造業
V	10	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

更請V變時打	董事、股東 或 其他負責人 名 單			
	編號	職稱	姓名(或法人名稱)	身分證號(或法人統一編號)	出資額(元)
		(郵遞區號)	住所或居所(或法人所在地)		
	1	董事	陳文政	G120582948	7,000,000
		(265) 宜蘭縣羅東鎮興東路161號			

經濟部中部辦公室 111.3.03 公司登記處專用章

公務記載蓋章欄

正本

檔號	00481683	保存年限	

經濟部　函

客服專線：4121166(手機撥號請加02)
地址：540南投縣南投市中興新村省府路４號
聯絡方式：　電話　049-2359171　分機　3105
承 辦 人：王小姐

269
宜蘭縣冬山鄉梅林路571號
受文者：政達木業有限公司

發文日期：中華民國111年03月03日
發文字號：經授中字第11133126040號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：非密件
附件：收據乙紙

主旨：貴公司於民國111年03月03日【收文日】申請公司所營事業變更、修正章程變更登記，經核符合規定，准予登記。

說明：

一、附規費收據一紙（變更登記表1份），嗣後凡向本部申請任何案件，請在申請書上註明公司統一編號89497279及檔案號碼（00481683）。

二、處分相對人名稱：政達木業有限公司（代表人姓名：陳文政、身分證照號碼：G12058****）、公司所在地：宜蘭縣冬山鄉梅林路571號。

三、對本處分如不服應於接到本處分書之次日起30日內繕具訴願書送由本部中部辦公室陳轉行政院提起訴願。

四、公司營業項目：C501990其他木製品製造業、C501010製材業、C501040組合木材製造業、C501060木質容器製造業、CA02010金屬結構及建築組件製造業、F401010國際貿易業、F111090建材批發業、F211010建材零售業、C901060耐火材料製造業、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

正本：政達木業有限公司
副本：宜蘭縣政府建設處（都市計畫科，使用管理科）、宜蘭縣政府消防局、宜蘭縣政府衛生局

部長 王美花

附件5

地理位置示意圖

圖一　位置圖（廣域）

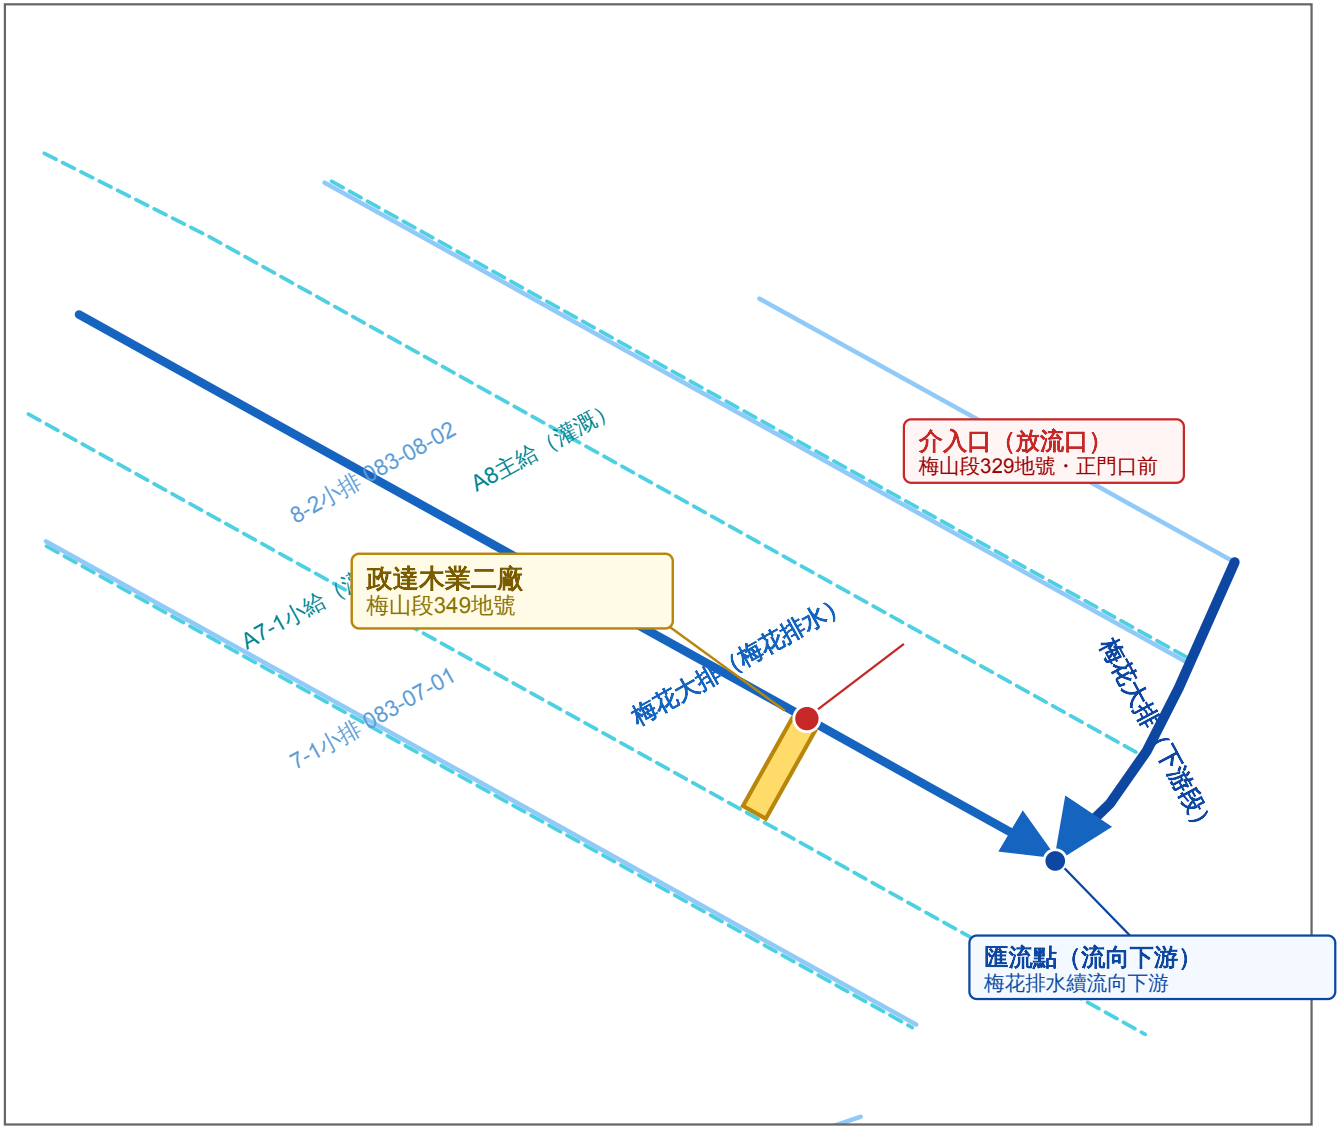


圖　例

- 政達木業二廠（梅山段349）
- 梅花大排（本次介入）
- 梅花大排下游段
- 其他排水渠道
- 灌溉渠道（不得排入）
- 介入口（放流口）
- 匯流點

放流口至承受水體流路

- ● 廠內化糞池／放流池（梅山段349）
- ▼ 介入口（梅山段329　水利用地）
- ▼ 梅花排水（梅山段329地號）
- ▼ 流向東南下游
- ▼ （宜蘭縣政府轄管區域排水）
- ▼ 梅花排水（圖外下游）

重要提醒

廠區西南側 4.1 公尺處為 A7-1小給，性質為「灌溉渠道」。依農田水利法第14條第1項，灌溉專用渠道原則禁止排放非農田排水，本案放流口不得設於該渠道，須由東北側接入梅花排水。

比例尺　約 1：7019（A4 橫向）

0　100　200　300　400　公尺

N


底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處「農田水利渠道查詢系統」渠道圖層（Canal民眾查詢1140917）
查詢日期 115.08.28　座標系統 TWD97 二度分帶（EPSG:3826）
註：渠道線形為圖資，僅供位置參考；實際位置及流向依現地與管理處初勘為準。

圖一　位置圖（廣域）

廠區位置與排水系統，放流口至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
｜　TWD97 二度分帶　｜　第 1 張，共 6 張

圖二　介入點位置圖（平面圖）

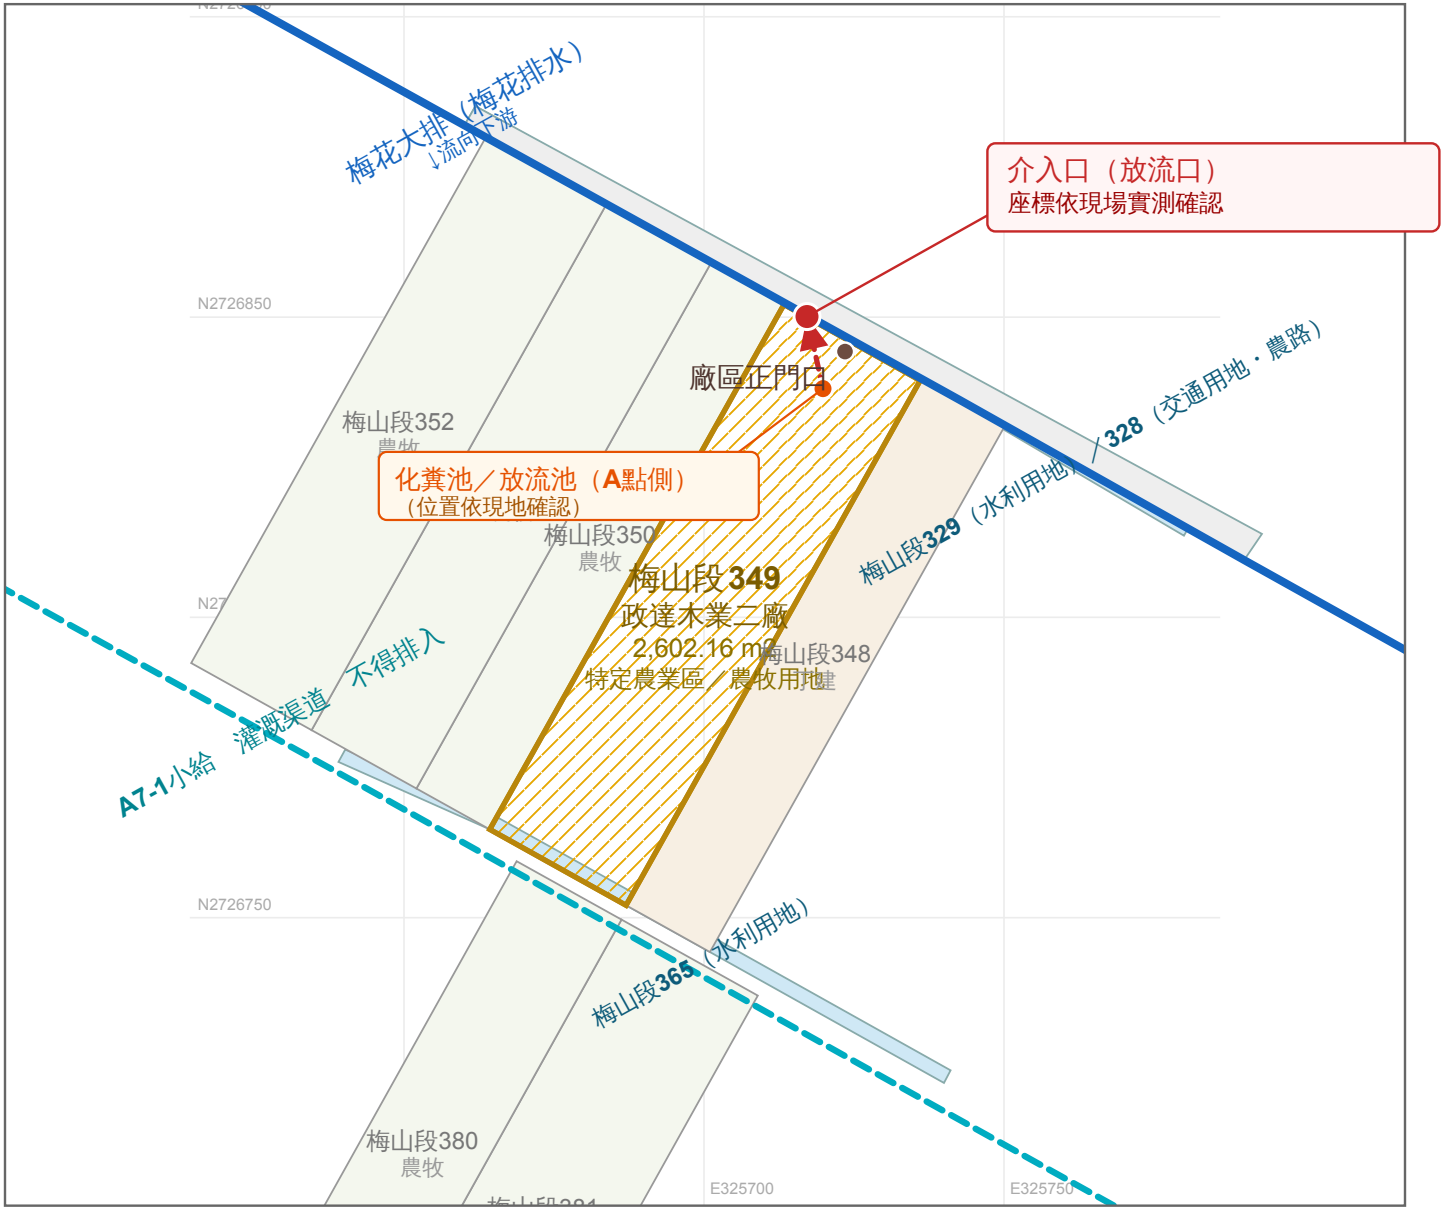

比例尺　約**1**：**1260**（**A4** 向）

0　20　40　60　80　公尺

N

底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處「農田水利渠道查詢系統」
地籍圖層114Oct地籍圖／渠道圖層Canal民眾查詢1140917　查詢日期115.08.28
註：渠道中心線為圖資線形，與現地略有偏差；介入口位置、椿號、坐標及渠道斷面依初勘實測為準。

圖　例

- 申請搭排土地（梅山段349）
- 水利用地（329／365）
- 交通用地（328　農路）
- 農牧用地
- 丁種建築用地
- 排水渠道　梅花大排（可搭排）
- 灌溉渠道　A7-1小給（禁止排入）
- 擬設放流管線
- 介入口（放流口）
- 化糞池／放流池

介入渠道：梅花排水（梅花大排）

放流口至承受水體流路

- ●廠內化糞池／放流池
- ▼介入口（梅山段329地號）
- ▼梅花排水（本次介入承受水體）
- ▼流向下游（宜蘭縣政府轄管區域排水）
- ▼梅花排水（承受水體）

案件資

申請人	政達木業有限公司二廠
負責人	陳文政
廠　址	冬山鄉得安村梅林路571-1號
納管編號	P0200190
排放水量	日最大2.25 m³／年最大821.25 m³

圖二　介入點位置圖（平面圖）

含放流口位置至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
｜　TWD97 二度分帶　｜　第2張，共6張

附件6

事業計畫書

附件3、計畫書/現況說明書　　（變更申請者免填）

農田水利設施範圍內之搭排計畫書/現況說明書

申請人名稱（或法人名稱）	政達木業有限公司	代表人/負責人姓名	陳文政
申請人國民身分證統一編號或其他身分證明文件字號（或營業人統一編號）	89497279	代表人/負責人國民身分證統一編號或其他身分證明文件字號（或營業人統一編號）	G120582948
申請人（代表人/負責人）聯絡地址	宜蘭縣 冬山市 鄉鎮市區 得安村梅林路 街 - 段 巷 弄571-1 號 樓		
申請人（代表人/負責人）行動電話	0932-164882	申請人（代表人/負責人）聯絡電話	(03)958-5175
申請目的[1]	■申請許可	□申請展延許可[3]	
	□辦理一般家戶及農舍，申請排放生活污水。 ■辦理非一般家戶及農舍，申請排放生活污水。 □辦理非一般家戶及農舍，申請排放非生活污水。		
是否屬公告事業[2]	■是(如登記工廠、特定工廠) □否(如農產品初級加工場、畜牧業) (僅非一般家戶及農舍需填報此項)		
申請依據	農田水利法第14條第2項。 農田灌溉排水管理辦法第10條(申請許可)、第15條(展延許可)。		
申請搭排期間[4]	自115年＿＿月＿＿日起至119年12月31日止		
搭排土地坐落地點 介入口地段號	宜蘭縣/市冬山區梅山段－小段32地號		
搭排土地坐落地點 介入口坐標[5] (TWD97)	X：＿＿＿＿＿＿＿＿，Y：＿＿＿＿＿＿＿＿		
搭排土地坐落地點 介入渠道[5]	渠道名稱[5]：梅花排水＿＿＿＿＿＿＿＿(＿＿K+＿＿M)		
	下游是否具引灌需求[5]：□是 ■否		
影響農田水利設施管理維護及其應變措施[6]	■無影響。 □有影響，應變措施：＿＿＿＿＿＿＿＿		
排放水量[7]	日平均排放水量：(非必填)＿＿m³	日最大排放水量：2.2 m³	
	年搭排日數：36日	年最大排放水量：82 m³	
污染防治設備[8]	■無 ； □有，污染防治設備：＿＿＿＿＿＿＿＿		

中華民國　　年　　月　　日

應檢附文件(檢核項目)			自我檢核
有無可排放至其他排水系統			□有，其他排水系統名稱： ■無
一	身分證明文件	□以個人名義申請者，檢附申請人身分證明文件正反面影本。 ■以法人名義申請者，檢附公司設立登記或變更登記表及代表人國民身分證影本。 □以商號名義申請者，檢附設立或變更登記證明文件及負責人身分證影本。 □政府機關、公有公用事業機構及公法人，得不檢附[9]。	■有 □無須檢附，原因：
		■委託他人申請者，檢附委託書及受委託人身分證明文件。	■有 □無須檢附，原因：
二	位置圖面	■介入點位置圖(平面圖，含放流口位置至承受水體)。 ■涉及工程者，其工程設計圖說。 ■借用他人土地者，應含設置於其土地管線位置圖說。	■有
三	土地證明	■地籍圖謄本(申請日前3個月內)。 ■土地登記第一類謄本(申請日前3個月內)。 ■土地使用同意證明(有需使用土地者，應檢附其土地使用證明文件。但需要使用之土地，已依農田水利法第23條第1項規定納入農田水利事業作業基金者，得免附)。	■有 □無須檢附，原因：
四	建物證明	□建築物建造執照影本(限一般家戶及農舍)。 □建築物使用執照影本。 ■尚未取得建築物建造執照或使用執照者，得免附；本署審核同意後應核發保留廢止權之許可。	□有 ■無，預計補正日期：
五	水質檢驗報告[10]	□申請日前3個月內，具認證實驗室出具之水質採樣檢驗報告(相關檢測項目皆應取得認證資格，且水質採樣作業應由取得相關認證之檢驗室派員辦理)。 ■尚未取得建築物使用執照者，應於取得並實際使用後3個月內檢附。	□有 ■無，預計補正日期：
六	現場照片	□現場照片(含申請地址大門口、介入點、介入渠道等)。 ■尚未完工(施工)者，檢附施工中(前)現場照片，並於完工後1個月內檢附完工現場照片。	□有 ■無，預計補正日期：
七	切結書	■切結書。 □其他：	■有 □無

搭排申請人屬事業者，應檢附文件(檢核項目)			自我檢核
八	事業登記證明[11]	□工廠登記證明文件影本。 □特定工廠登記證影本。 □農產業事業登記證影本。 (如畜牧、畜禽、水產養殖、農產業初級加工場等或其他相關證明) ■其他：工廠改善計畫核定函影本（府旅商字第1130980315號）	■有 □無須檢附，原因：
九	事業環保證明[12]	□已申請水污染防治措施計畫及許可，尚未取得許可證者，應檢附環保主管機關受理申請證明文件影本。 □已取得水污染防治許可證者，應檢附其許可證影本。 ■相關主管機關以公文說明無事業製程廢水產生。(申請排放生活污水)[12]	□有 ■無須檢附，原因：
十	其他		□有 □無

備　　註

1. 依據農田水利法第14條規定略以，灌溉專用渠道原則禁止搭排。另外，依據農田灌溉排水管理辦法第11條規定略以，計畫書應記載內容包含申請之目的、依據。
2. 依據農田水利法第29條第3項所定事業稱為公告事業。
3. 依據農田灌溉排水管理辦法第15條相關規定提出申請展延申請。
4. 依據農田灌溉排水管理辦法第14、15條規定及辦理，初次申請者/展延申請者之許可有效期間：
   (1) 許可/展延期限不得超過土地使用同意證明文件之期限。
   (2) 申請一般家戶及農舍申請搭排者，有效期間不得超過20年。
   (3) 前款以外之申請人申請搭排者，有效期間不得超過5年且不得超過事業登記證明之有效期限。
5. 介入點坐標、介入渠道申請人得於機關辦理初勘確認後填寫。
6. 若有影響農田水利設施管理維護之虞，應提出相關應變措施。
7. 排放水量建議參照內政部建築物污水處理設施設計技術規範之表2-1建築物污水處理設施使用人數、污水量及水質參考表；屬水產養殖業，排放水量計算參考水權登記審查作業要點附件三相關需水量計算。
8. 污染防治設備係因不同的搭排申請類別，所具備之污染防治設備類型亦不同。除事業類別係指是否具有水污染防治許可證或其他廢污水處理設備；畜牧業係指是否具備三段式廢水處理設備、或具有辦理部分沼液沼渣相關證明；住宅類別係指是否具水肥池、化糞池、預鑄式污水處理槽等設施。
9. 公有公用事業機構：為「公有營業機關」和「公有事業機關」，前者具營利目標(如大型金融行庫-臺灣銀行、能源-台灣電力公司/台灣中油股份有限公司、水資源-台灣自來水股份有限公司、與交通相關企業-台灣鐵管理局)，後者屬非營利性質(如公立學校和公立醫院等)；公法人：地方自治團體(直轄市、縣市、鄉鎮市)、行政法人(如，國家中山科學研究院、國家災害防救科技中心、國家運動訓練中心)。
10. 水質檢驗報告：樣品之採樣、保存、檢測、品質管制方式應依非農田排水之灌溉水質基準值檢測方式及品質管制作業準則規定，且依據環保署公告標準方法及相關指引，並取得相關許可之檢驗室辦理。為符合前揭規定，水質採樣作業亦應由取得採樣方法

許可之認證檢驗室派員執行。檢驗項目依據農田灌溉排水管理辦法等相關規定辦理。

11. 申請人屬非一般家戶及農舍(事業)者，應依事業別檢附相關證明文件。
12. 申請人屬非一般家戶及農舍(事業)者，應依水污染防治法、工廠管理輔導法或其他相關法規，向目的事業主管機關函詢，並由前述機關以公文說明無事業製程廢水。
13. 應檢附文件規定內容如下：至少各**1**式**4**份，如有需要得由各管理處視情況增減；未加註影本者須提供至少1份正本。如為影本須加蓋申請人印章及「與正本相符」字樣，請以 A4規格紙張影印，對齊裝訂左邊頁，並以標籤依序編碼，裝訂成冊。

註：本表所留之空格如不敷使用，可依實際需要自行製作填寫。(※需按照格式)

附件7

施工計畫書(含防汛計畫書)

政達木業有限公司二廠 既設版橋及生活污水搭排梅花排水介入口工程施工計畫書(含防汛計畫)

項目	內容
申請人	政達木業有限公司二廠(統一編號 89497279)
負責人	陳文政
工廠地址	宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路 571-1 號(冬山鄉梅山段 349 地號)
施工地點	宜蘭縣冬山鄉梅山段 329 地號(水利用地,梅花排水),廠區正門口前
承受水體	梅花排水(宜蘭縣政府管理之區域排水)
施工廠商	【待補:廠商名稱、統編、電話】
編製日期	中華民國 115 年 11 月 【　】 日

壹、工程概要

一、工程緣由

本公司二廠工廠改善計畫經宜蘭縣政府 113 年 11 月 22 日府旅商字第 1130980315 號函核定,改善期限經 115 年 8 月 28 日府旅商字第 1150152621 號函准予展延至 116 年 5 月 21 日。廠內生活污水擬經化糞池處理後,以埋設管線排入梅花排水。使用梅山段 329 地號水利用地部分,已經農業部農田水利署 115 年 10 月 28 日農水宜字第 1158104356 號函許可(期間 115 年 9 月 23 日至 119 年 12 月 31 日);依該函說明四,另向宜蘭縣政府申請排放許可,並檢附本施工計畫書。

二、工程內容

項目	內容	備註
排放水種類	生活污水(廁所、盥洗、廚房),經化糞池處理	無製程廢水(木材乾式加工)
排放量	每日 2.25 立方公尺,年 365 日,年 821.25 立方公尺	依搭排計畫書
放流管	管材【待補】,管徑【待補】mm,長度約【待補】m	建議 PVC 管 100 mm(4 吋)以上,由施工廠商依設計確認
管線路徑	廠內放流池 → 正門口 → 梅山段 329 地號 → 梅花排水護岸	詳圖二、圖四
介入口型式	☐埋管 ☐附掛 ☐明溝銜接【待選】	詳圖六
護岸開孔	尺寸【待補】,開孔後以混凝土或無收縮水泥砂漿封填	不得降低護岸結構強度
管口高程	管底高程【待補】m,高於渠道常水位	避免倒灌
介入口坐標	TWD97 E 325727.90、N 2726851.58	依會同放樣結果為準

二之一、既設版橋

項目	內容
位置	廠區正門口,跨越梅花排水(梅山段 329 地號),連接梅山段 328 地號農路與 349 地號廠區
現況	**已施設完成**,本次併案申請補辦許可,不另施工
尺寸	長約 4 公尺(跨越渠道方向),寬約【待補】公尺
構造	【待補:鋼筋混凝土版橋/其他】
用途	廠區人員及車輛出入通行
維護管理	由申請人負責;定期清除橋下淤積與雜物,確保不阻礙通水;防汛期前檢查橋面及橋臺

> 放流管線介入口位置應避開版橋橋臺,以免影響橋體結構(依會同放樣結果調整)。

三、預定工期

自會同放樣完成之翌日起約 **5 個工作天**(不含材料進場與養護等待)。預定施工期間:115 年 【　】 月 【　】 日至 【　】 月 【　】 日,**避開防汛期**(詳肆、防汛計畫)。

貳、施工組織與聯絡

職務	姓名	電話	職責
申請人代表	陳文政(負責人)	0932-164882	工程總負責、對外協調
受託聯絡人	鄭玉屏	0975-328-779	申請文件、機關聯繫
施工廠商負責人	【待補】	【待補】	施工執行、品質與安全
現場負責人	【待補】	【待補】	每日現場管理,施工期間全程在場
防汛聯絡人(24 小時)	【待補】	【待補】	颱風豪雨期間應變

參、施工方法與步驟

一、施工前準備

1. 取得宜蘭縣政府排放許可(排水許可證明)後始得施工。
2. 施工前 **7 日** 以書面通知宜蘭縣政府水利資源處及農業部農田水利署宜蘭管理處羅東工作站,會同現場放樣,確認介入口位置、樁號、高程與管線路徑。
3. 查詢地下管線(自來水、電力、電信)位置,避免挖損。
4. 現場設置施工告示牌(載明工程名稱、許可文號、施工期間、施工廠商及聯絡電話)及安全圍籬、警示燈。
5. 備妥防汛器材(詳肆、三)。

二、施工步驟

步驟	工作內容	注意事項
1 放樣	會同機關人員放樣,標示管線中心線、介入口位置及開挖範圍	拍照留存
2 開挖	以小型機具或人工開挖管溝,深度【待補】m,寬度以管徑加兩側各 20 cm 為原則	開挖土方堆置於渠道外側,不得推入渠道
3 管線埋設	管溝底鋪砂墊層約 10 cm,依設計坡度(不小於 1%)埋設放流管,接頭密封	通水試驗確認無滲漏
4 護岸開孔與介入口	於梅花排水護岸依設計尺寸開孔,置入管口,管口與護岸面齊平或依圖六施作,周邊以無收縮水泥砂漿封填	開孔採鑽孔或切割,不得以重錘破壞護岸;管口不得突出妨礙通水
5 回填	以砂或原土分層回填夯實,每層不超過 30 cm	回填高程與原地面齊平
6 復舊	農路(梅山段 328)路面、護岸及植生依原狀復舊	復舊標準不低於原狀
7 清理	清除渠道內施工殘料、土石,拆除臨時設施	渠道斷面回復施工前狀態
8 竣工	拍攝竣工照片,報請宜蘭縣政府竣工查驗;並依農田水利署許可函報羅東工作站	查驗合格後懸掛許可證明標示牌

三、渠道通水維持

1. 施工期間**不得阻斷梅花排水通水**;護岸開孔作業時段選擇低水位時施作。
2. 如須於渠道內作業,以沙包圍堰局部隔離作業區,保留足夠通水斷面,作業完成當日拆除。
3. 每日收工前檢查渠道內無土石、材料殘留。

肆、防汛計畫

一、施工時段

1. 宜蘭地區颱風及豪雨主要發生於每年 5 月至 11 月,本工程**以 12 月至翌年 4 月施工為原則**;如因許可時程須於上述期間施工,應縮短工期並加強應變。
2. 中央氣象署發布本地區豪雨特報、海上或陸上颱風警報時,不得進行護岸開孔及渠道內作業。

二、監測與預警

1. 現場負責人每日上工前查詢中央氣象署天氣預報及水利署防災資訊,並留意梅花排水水位。
2. 渠道水位明顯上漲或上游降雨增大時,立即停止渠道內作業,人員機具撤離至安全處所。

三、防汛器材(施工期間置於現場)

器材	數量	用途
沙包	30 包以上	開孔處臨時封堵、防止倒灌
抽水機	1 台	管溝及作業區積水抽排
帆布 / 防水布	2 張	覆蓋開挖面及堆置土方
照明燈具、警示燈	各 2 組	夜間警示

器材	數量	用途
救生圈、救生繩	各 1 組	人員落水救援

三之一、既設版橋防汛

1. 每年 5 月防汛期前及颱風警報發布前,清除版橋橋下淤積、漂流物及雜物,確保通水斷面。
2. 颱風豪雨過後檢查橋面、橋臺有無沖刷、裂損,發現異狀即通報宜蘭縣政府水利資源處並修復。

四、颱風豪雨應變程序

1. **警報發布前(預報期間)**:暫停施工;開挖管溝回填或覆蓋;護岸已開孔未封填者,以沙包及防水布臨時封堵;清除渠道內材料、土石及臨時設施;機具移至渠道及農路以外高處。
2. **警報期間**:禁止人員進入渠道及護岸範圍;防汛聯絡人 24 小時待命。
3. **警報解除後**:檢查護岸、管線、農路及臨時設施有無損壞,發現損壞立即通報宜蘭縣政府水利資源處及羅東工作站並修復;確認安全後始得復工。

五、緊急聯絡

單位	電話
宜蘭縣政府水利資源處水利行政科	(03)925-1000 分機 8152
農業部農田水利署宜蘭管理處羅東工作站	【待補】
農田水利署宜蘭管理處(承辦陳駿毅)	(03)925-5000 分機 257
冬山鄉公所	【待補】
消防、救護	119
警察	110

伍、交通維持與環境保護

1. 梅山段 328 地號農路開挖時,**採半幅施工,保持單線通行**,設置警示燈、交通錐及告示;夜間不留開挖面,無法回填時以鋼板覆蓋並設警示燈。
2. 施工產生之土方、廢棄物當日清運,不得棄置於渠道、農路或鄰地。
3. 施工泥水不得直接排入梅花排水;灑水抑制揚塵。
4. 施工時間為上午 8 時至下午 5 時,避免夜間噪音。
5. 施工期間不得影響鄰近 A7-1 小給(灌溉渠道)之通水,且**放流管不得接入灌溉渠道**。

陸、職業安全衛生

1. 施工人員應配戴安全帽、反光背心;渠道邊作業應穿著救生衣。
2. 開挖深度超過 1.5 m 時應設擋土支撐或放坡。
3. 機具操作人員應具相關資格;施工前辦理安全宣導。

4. 發生事故時立即停工、救護並通報。

柒、品質管理與竣工查驗

1. 管材進場檢查規格(管材、管徑、厚度)並留存出貨證明。
2. 管線埋設完成回填前,拍照記錄管徑、坡度、埋設深度,並做通水試驗。
3. 護岸開孔前後、封填完成、復舊完成各階段拍照(含日期)。
4. 竣工後檢附竣工圖、施工照片、材料證明,報請宜蘭縣政府竣工查驗;依農田水利署許可函,同時報羅東工作站。
5. 查驗合格後於介入口附近懸掛排水許可證明標示牌,並報府備查。

捌、施工承諾事項

1. 施工前 7 日通知宜蘭縣政府及農田水利署宜蘭管理處羅東工作站,會同放樣後始得施工。
2. 施工期間不阻斷渠道通水,必要時設置臨時導水設施。
3. 施工損壞水利設施、護岸或農路者,由本公司負責無條件修復或賠償。
4. 工程費用由本公司負擔。
5. 許可期間屆滿或經廢止時,由本公司自費拆除管線並回復原狀。
6. 遵守主管機關現勘及審查意見,並依指示改善。

附件

- 圖一 位置圖(廣域)
- 圖二 介入點位置圖(平面圖)
- 圖三 地籍圖套繪圖
- 圖四 借用他人土地管線位置圖說
- 圖五 排水系統流路圖
- 圖六 介入口工程設計圖


申請人:政達木業有限公司二廠　　負責人:陳文政　(蓋公司大小章)

施工廠商:【待補】　　負責人:【待補】　(蓋章)

附件8

工程用地套繪(地籍圖及河川圖籍)

圖三　地籍圖套繪圖

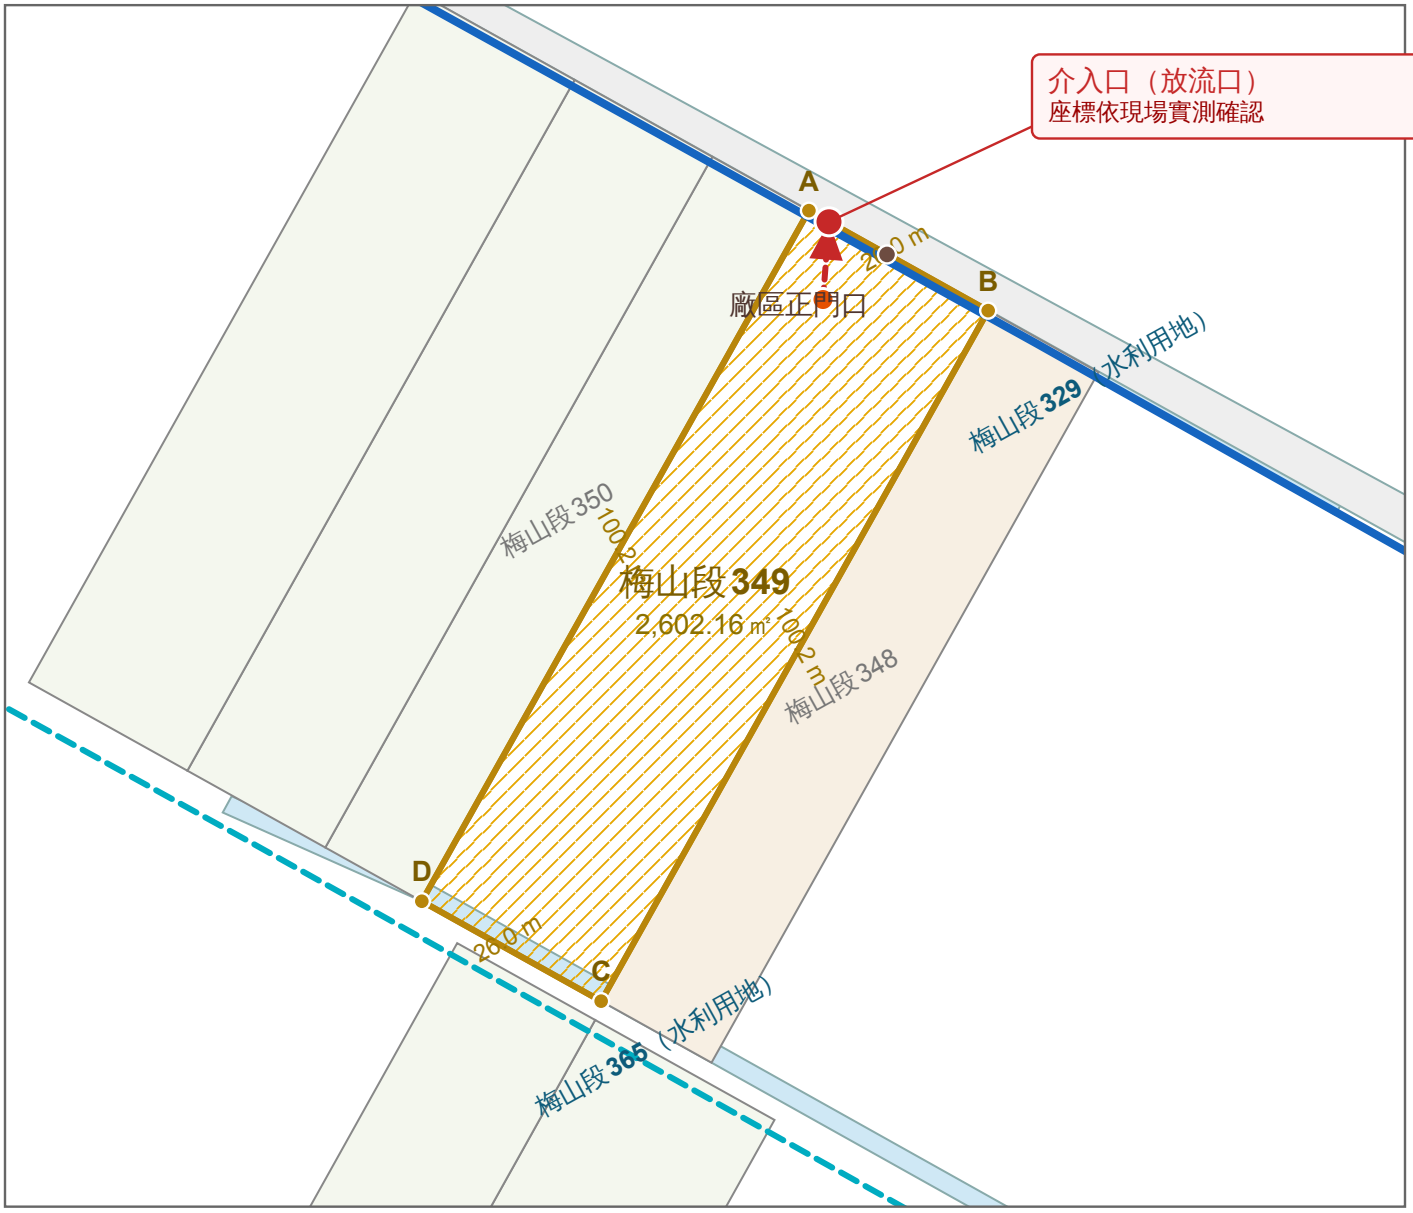

界址點坐標（TWD97 二度分帶）

點號	E（m）	N（m）
A	325713.33	2726852.09
B	325736.04	2726839.44
C	325687.01	2726752.07
D	325664.29	2726764.71

介入口　依現場實測　　確認

坐標為圖資推估值，界址以複丈鑑界結果為準。
介入口位置依管理處初勘確認。

土地標示

地　號	宜蘭縣冬山鄉梅山段349地號
重測前	梅花段1708-0000
面　積	2,602.16平方公尺
使用分區	特定農業區
用地類別	農牧用地
所有權人	陳文政（全部1分之1）
謄本字號	羅東謄字第014081號
核發日期	民國115年8月28日

地號

東北：梅山段329（水利用地）←介入口
西南：梅山段365（水利用地）
東南：梅山段348（丁種建築用地）
西北：梅山段350（農牧用地）

比例尺　約**1**：**958**（**A4** 向）

0　10　20　30　40　公尺

N

底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處渠道查詢系統地籍圖層（114Oct地籍圖）；地籍圖謄本：宜蘭縣羅東地政事務所羅東謄字第014081號（115.08.28，1/500）。
註：本圖為套繪示意，界址以複丈鑑界結果為準；正式送件請於地籍圖謄本正本上套繪搭排位置並簽章。

圖三　地籍圖套繪圖


搭排位置套繪於地籍圖

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
｜　TWD97 二度分帶　｜　第3張，共6張

附件9

設計圖說

圖四　借用他人土地　管線位置圖說

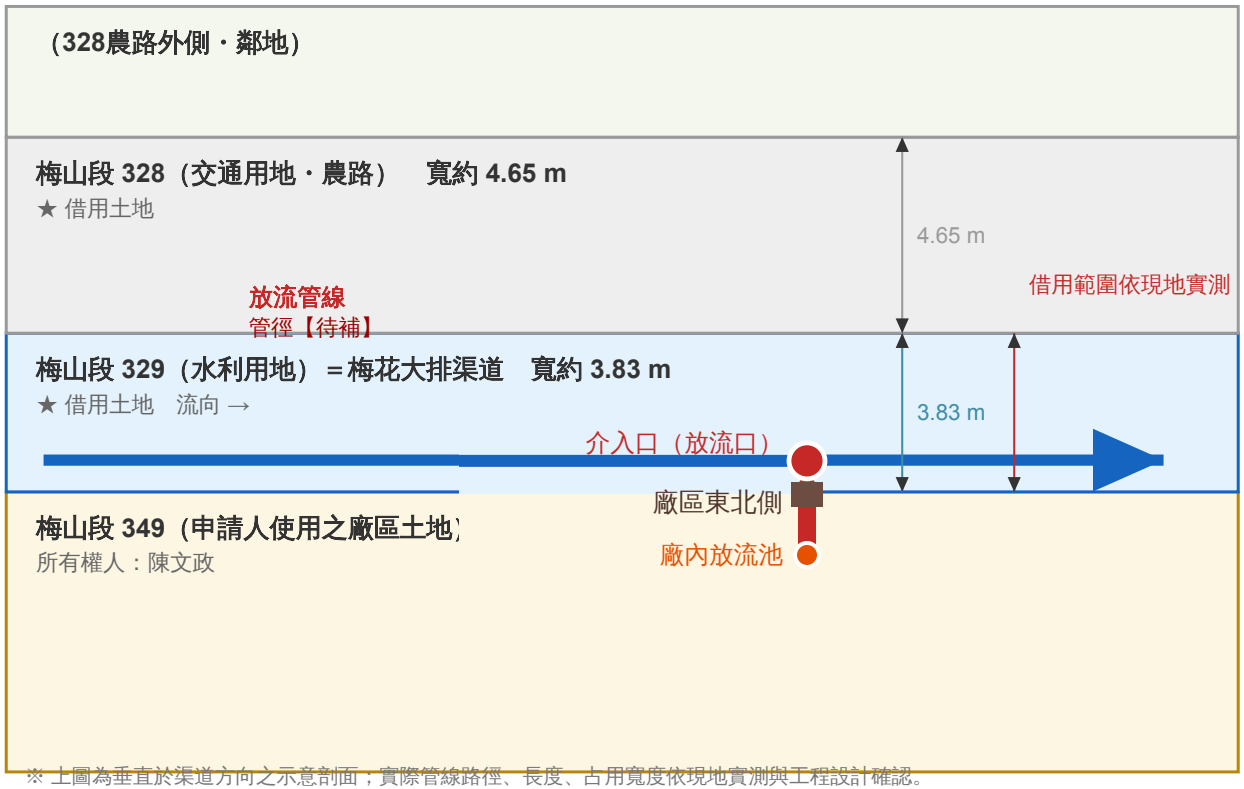

※ 上圖為垂直於渠道方向之示意剖面；實際管線路徑、長度、占用寬度依現地實測與工程設計確認。

鄰接公有土地明細

地號	用地類別	通過長度	面積
梅山段329	水利用地	約 3.83 m	2,090.9㎡
梅山段328	交通用地	—	5,123.8㎡

占用寬度：以管徑計（【待補】）
埋設深度：【待補】 m
施設方式：☐ 埋管　☐ 附掛　☐ 明溝銜接
兩筆土地均為公有性質用地。依官方應檢附文件三，需使用之土地如已依農田水利法第23條第1項納入農田水利事業作業基金者，得免附土地使用同意證明；權屬請調謄本並洽羅東工作站確認。

施設承諾

1. 管線施設不妨礙農路通行及渠道通水。
2. 施工前 7 日通知管理處及羅東工作站，會同放樣後始得施工。
3. 路面及護岸開挖後即時復舊，回復原狀。
4. 損壞農田水利設施或農路者，由本公司負責無條件修復或賠償。
5. 許可期間屆滿或廢止時，自費拆除管線並回復原狀。

介入口坐標（TWD97）


E　325727.90
N　2726851.58
椿號：依初勘實測為準

圖四　借用他人土地管線位置圖說
管線通過梅山段329地號（梅花大排渠道）

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（尺寸待實測）　|　TWD97 二度分帶　|　第 4 張，

註：本圖為官方應檢附文件「借用他人土地者，應含設置於其土地管線位置圖說」之圖說。實際借用範圍、長度及是否須另取得土地使用同意，依地籍謄本權屬及管理處初審結果為準。

圖五　排水系統流路圖

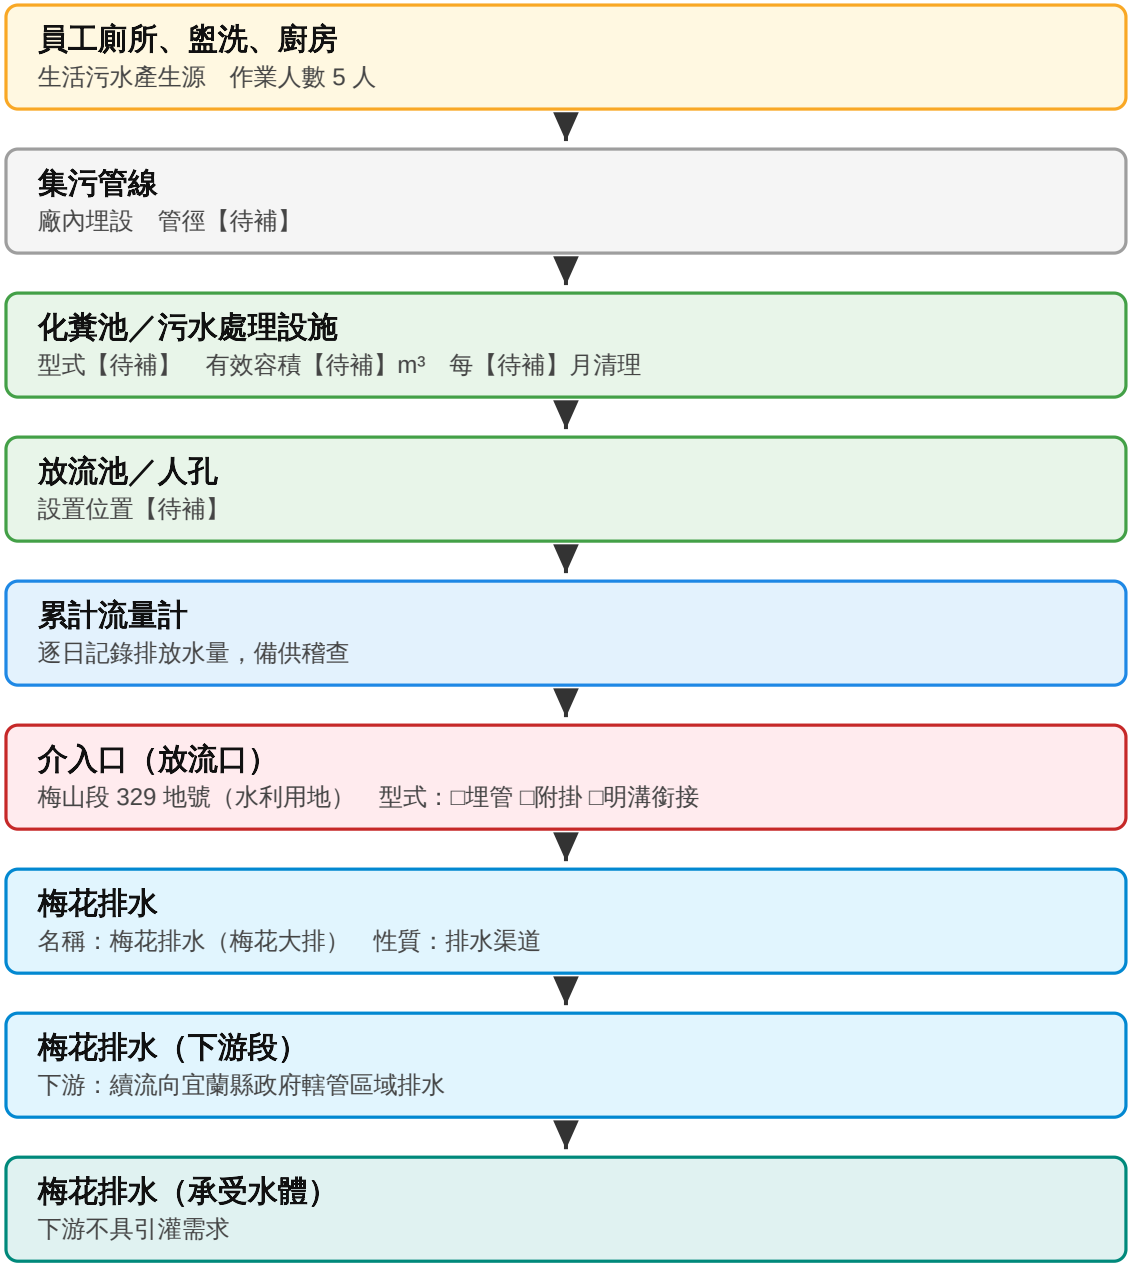

排放水量

作業人數	5 人
單位污水量	150 公升／人·日
日平均排放量	**0.75 m³**
尖峰係數	3.0
日最大排放量	**2.25 m³**
年搭排日數	365 日
年最大排放量	**821.25 m³**

計算依據

內政部「建築物污水處理設施設計技術規範」
表2-1　C-1 工廠（廠房）類
單位污水量 150 公升／人·日
（規範得按作業人數1/4計，本案不折減，
以全員5人計算，屬保守估計）

排放水性質

僅生活污水（廁所、盥洗、廚房）
無製程廢水：木材裁切、刨光、砂磨、
組裝、乾燥等乾式加工，製程不產生廢水
納管申請書已聲明：屬低污染行業別，
製程不含脫脂、酸洗、電鍍或陽極處理
（納管編號 P0200190）


註：【待補】欄位須依廠內既有污水處理設施現況填寫；介入口型式與管徑依初勘及工程設計確認。

圖五　排水系統流路圖
生活污水自產生源至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（無比例）　|　TWD97 二度分帶　|　第 5 張，共 6 張


圖六　介入口工程設計圖（平面・剖面）

（一）平面圖

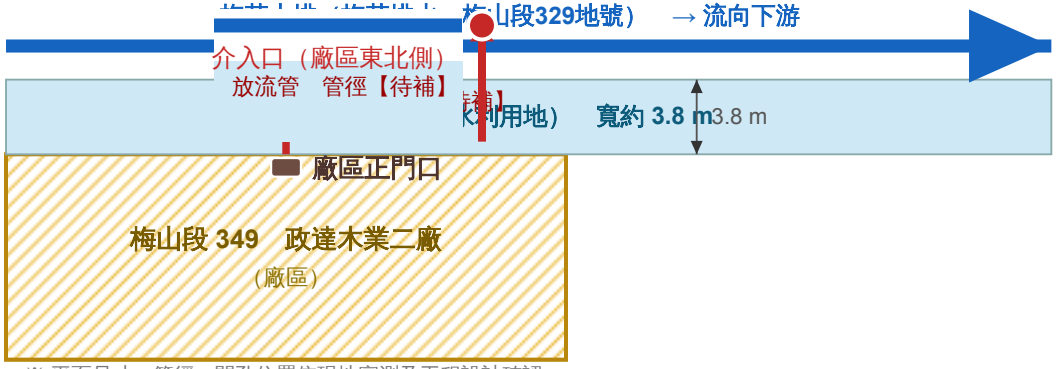

※ 平面尺寸、管徑、開孔位置依現地實測及工程設計確認

（二）縱剖面圖

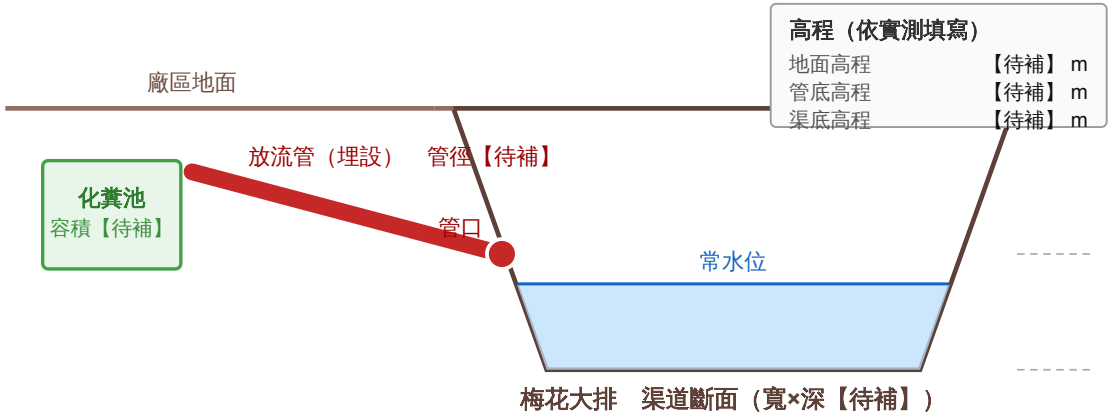

※ 高程、管徑、渠道斷面尺寸依現地實測填寫；施工前7日通知管理處及工作站會同放樣。

介入口規格（待填）

介入口型式	□ 埋管　□ 附掛　□ 明溝銜接
管材	【待補】
管徑	【待補】 mm
管底高程	【待補】 m
渠道底高程	【待補】 m
渠道斷面（寬×深）	【待補】
護岸開孔尺寸	【待補】
回填與復舊方式	【待補】
施工廠商	【待補】

施工承諾事項

1. 施工前 7 日通知管理處及羅東工作站，會同放樣後始得施工。
2. 施工期間不阻斷渠道通水，必要時設置臨時導水設施。
3. 施工損壞農田水利設施者，由本公司負責無條件修復或賠償。
4. 竣工後 30 日內報請管理處查驗。
5. 避開灌溉期施工；如須於灌溉期施工，事先報經管理處同意。
6. 工程費用由本公司負擔。


圖六　介入口工程設計圖

平面圖・縱剖面圖

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（尺寸待實測）　|　TWD97 二度分帶　|　第 6 張，


圖七　既設版橋平面圖・縱剖面圖

(一)平面圖

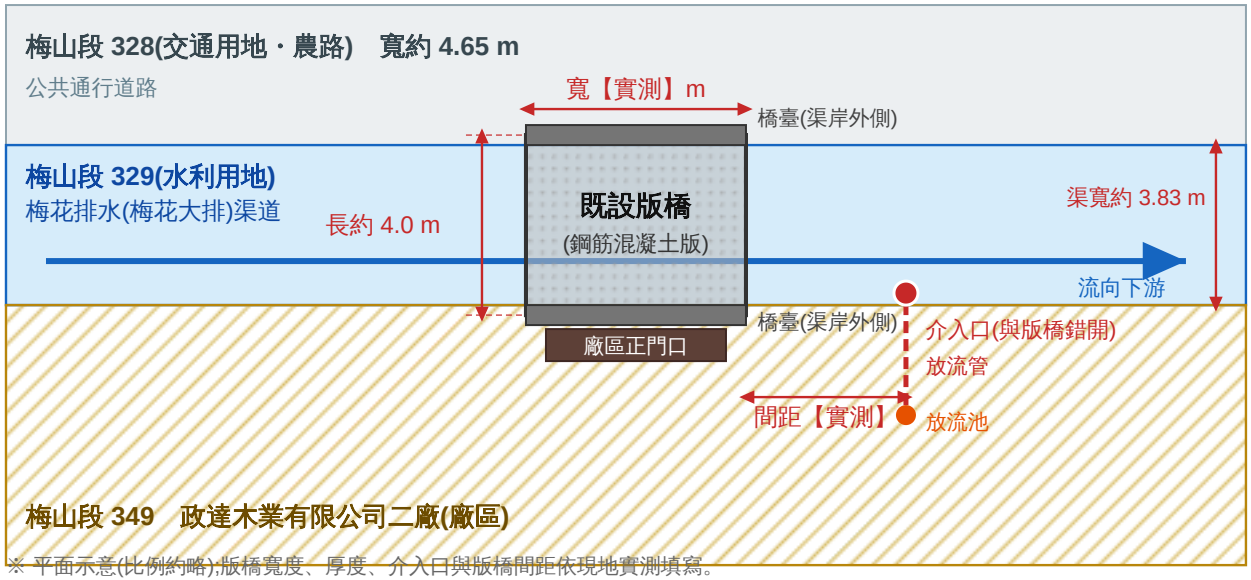

※ 平面示意(比例約略);版橋寬度、厚度、介入口與版橋間距依現地實測填寫。

(二)縱剖面圖(沿版橋中心線,垂直渠道方向)

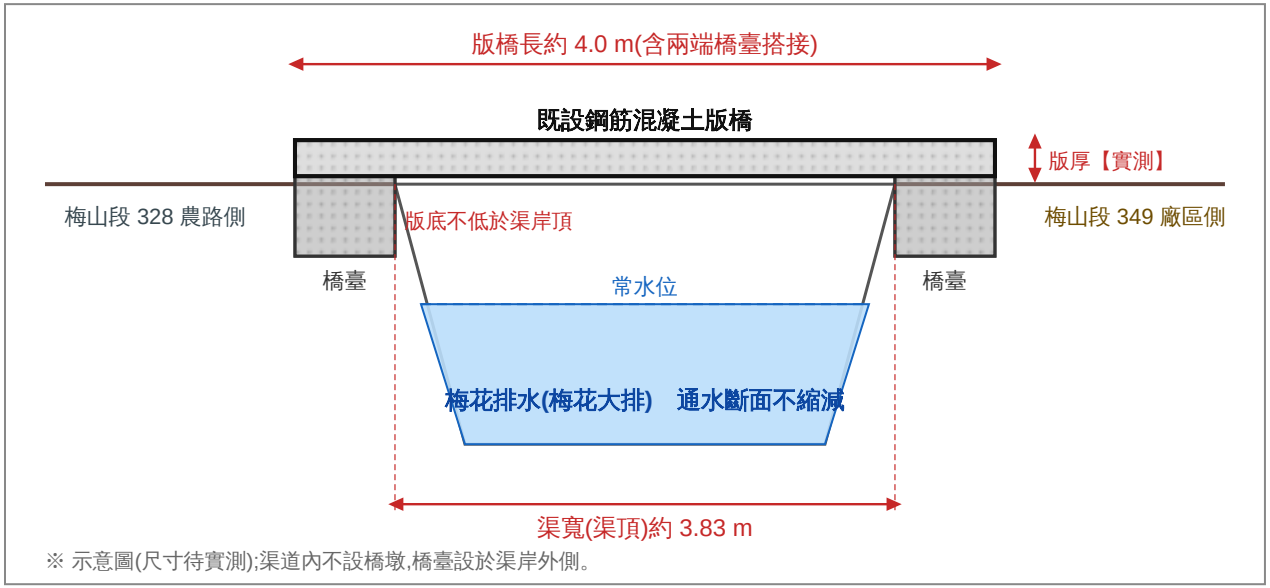

※ 示意圖(尺寸待實測);渠道內不設橋墩,橋臺設於渠岸外側。

既設版橋規格(現況)

位　　置	廠區正門口,梅山段329地號
跨越水路	梅花排水(宜蘭縣管區域排水)
連　　接	梅山段328農路 ↔ 349廠區
現　　況	已施設完成(補辦申請)
型　　式	鋼筋混凝土版橋【確認】
長　　度	約 4.0 m(渠寬約 3.83 m)
寬　　度	【實測】m
版　　厚	【實測】cm
橋臺位置	渠岸外側,渠內無橋墩
用　　途	廠區人員及車輛出入通行
數　　量	一處一座
施設年份	【待補】

設置原則與承諾事項

1. 版橋長度約 4 m,在 6 m 以內,一處一座。
2. 渠道內不設橋墩,橋臺設於渠岸外側,不縮減梅花排水通水斷面。
3. 版底不低於渠岸頂,不妨礙排水及渠道維護。
4. 放流管介入口與版橋錯開,不設於橋下。
5. 每年防汛期前及颱風警報前清除橋下淤積、漂流物;災後檢查橋面與橋臺並報府。
6. 維護管理由申請人負責;主管機關認有妨礙河防或通水時,依指示改善或自費拆除。

依據:宜蘭縣政府水利事業(跨越水道)建造物申辦規定;
農業部農田水利署宜蘭管理處版橋規定(長度 6 m 以內、一處一座)。

圖七　既設版橋平面圖・縱剖面圖

跨越梅花排水(梅山段329地號)

案名:政達木業有限公司二廠既設版橋及生活污水搭排
示意圖(尺寸待實測)　|　第 7 張,共 7 張

【待補】

既設版橋 現況照片

請拍版橋照片:正面、側面、橋下通水情形各1張,放在這一頁。並量測寬度、版厚、介入口與版橋間距,告知後填入圖七。

附件10

土地登記簿謄本

土地登記第二類謄本（地號全部）
冬山鄉梅山段 0329-0000地號

列印時間：民國115年09月12日16時03分　　頁次：1

本謄本係網路申領之電子謄本，由張哲源自行列印
謄本種類碼：XU!XAQW6，可至https://ep.land.nat.gov.tw查驗本謄本之正確性
羅東地政事務所　主　任　　吳啓賢
羅東電謄字第127107號
資料管轄機關：宜蘭縣羅東地政事務所　謄本核發機關：宜蘭縣羅東地政事務所

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　土地標示部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

登記日期：民國090年11月05日　　登記原因：地籍圖重測
面　　積：****2,090.90平方公尺
使用分區：特定農業區　　使用地類別：水利用地
民國115年01月　　公告土地現值：****3,800元／平方公尺
地上建物建號：共0棟
其他登記事項：重測前：梅花段１４４３－０００００地號

本謄本未申請列印地上建物建號，詳細地上建物建號以登記機關登記為主

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　土地所有權部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（0001）登記次序：0002
登記日期：民國109年11月26日　　登記原因：接管
原因發生日期：民國109年10月01日
　所有權人：中華民國
　統一編號：0000000158
　住　　址：（空白）
　管 理 者：農業部農田水利署
　統一編號：87516567
　住　　址：新北市新店區北新路一段４５巷５號
權利範圍：全部 *********1分之1*********
權狀字號：---（空白）字第------號
當期申報地價：115年01月******470.0元／平方公尺
前次移轉現值或原規定地價：
076年07月　　******112.0元／平方公尺
歷次取得權利範圍：全部 *********1分之1*********
其他登記事項：申請免繕發權利書狀：辦理公有土地權利登記
〈 本謄本列印完畢 〉

※注意：一、本電子謄本係依電子簽章法規定產製，其所產製為一密文檔與地政事務所核發紙張謄本具有同等效用。
二、若經列印成紙本已為解密之明文資料，僅供閱覽。本電子謄本要具文書證明效力，應上網至　https://ep.land.nat.gov.tw　網站查驗，以上傳電子謄本密文檔案，或輸入已解密之明文地政電子謄本第一頁的謄本種類碼，查驗謄本之完整性，以免被竄改，惟本謄本查驗期限為三個月。
三、本謄本之處理及利用，申請人應注意依個人資料保護法第５條、第１９條、第２０條及第２９條規定辦理。
四、本土地有下列類別之參考資訊：公產機關管理不動產之相關資訊，請查閱土地參考資訊。土地建物參考資訊檔查詢網站網址：https://moiref.moi.gov.tw/pubref/
五、前次移轉現值資料，於課徵土地增值稅時，仍應以稅捐稽徵機關核算者為依據。

謄本僅供參考 地政事務所

地籍圖謄本

羅東電謄字第127107號

土地坐落：宜蘭縣冬山鄉梅山段329地號共1筆


本謄本與地籍圖所載相符（實地界址以複丈鑑界結果為準）

北

資料管轄機關：　宜蘭縣羅東地政事務所

本謄本核發機關：　宜蘭縣羅東地政事務所　　主任：吳啓賢

中　華　民　國　　115年09月12日16時03分

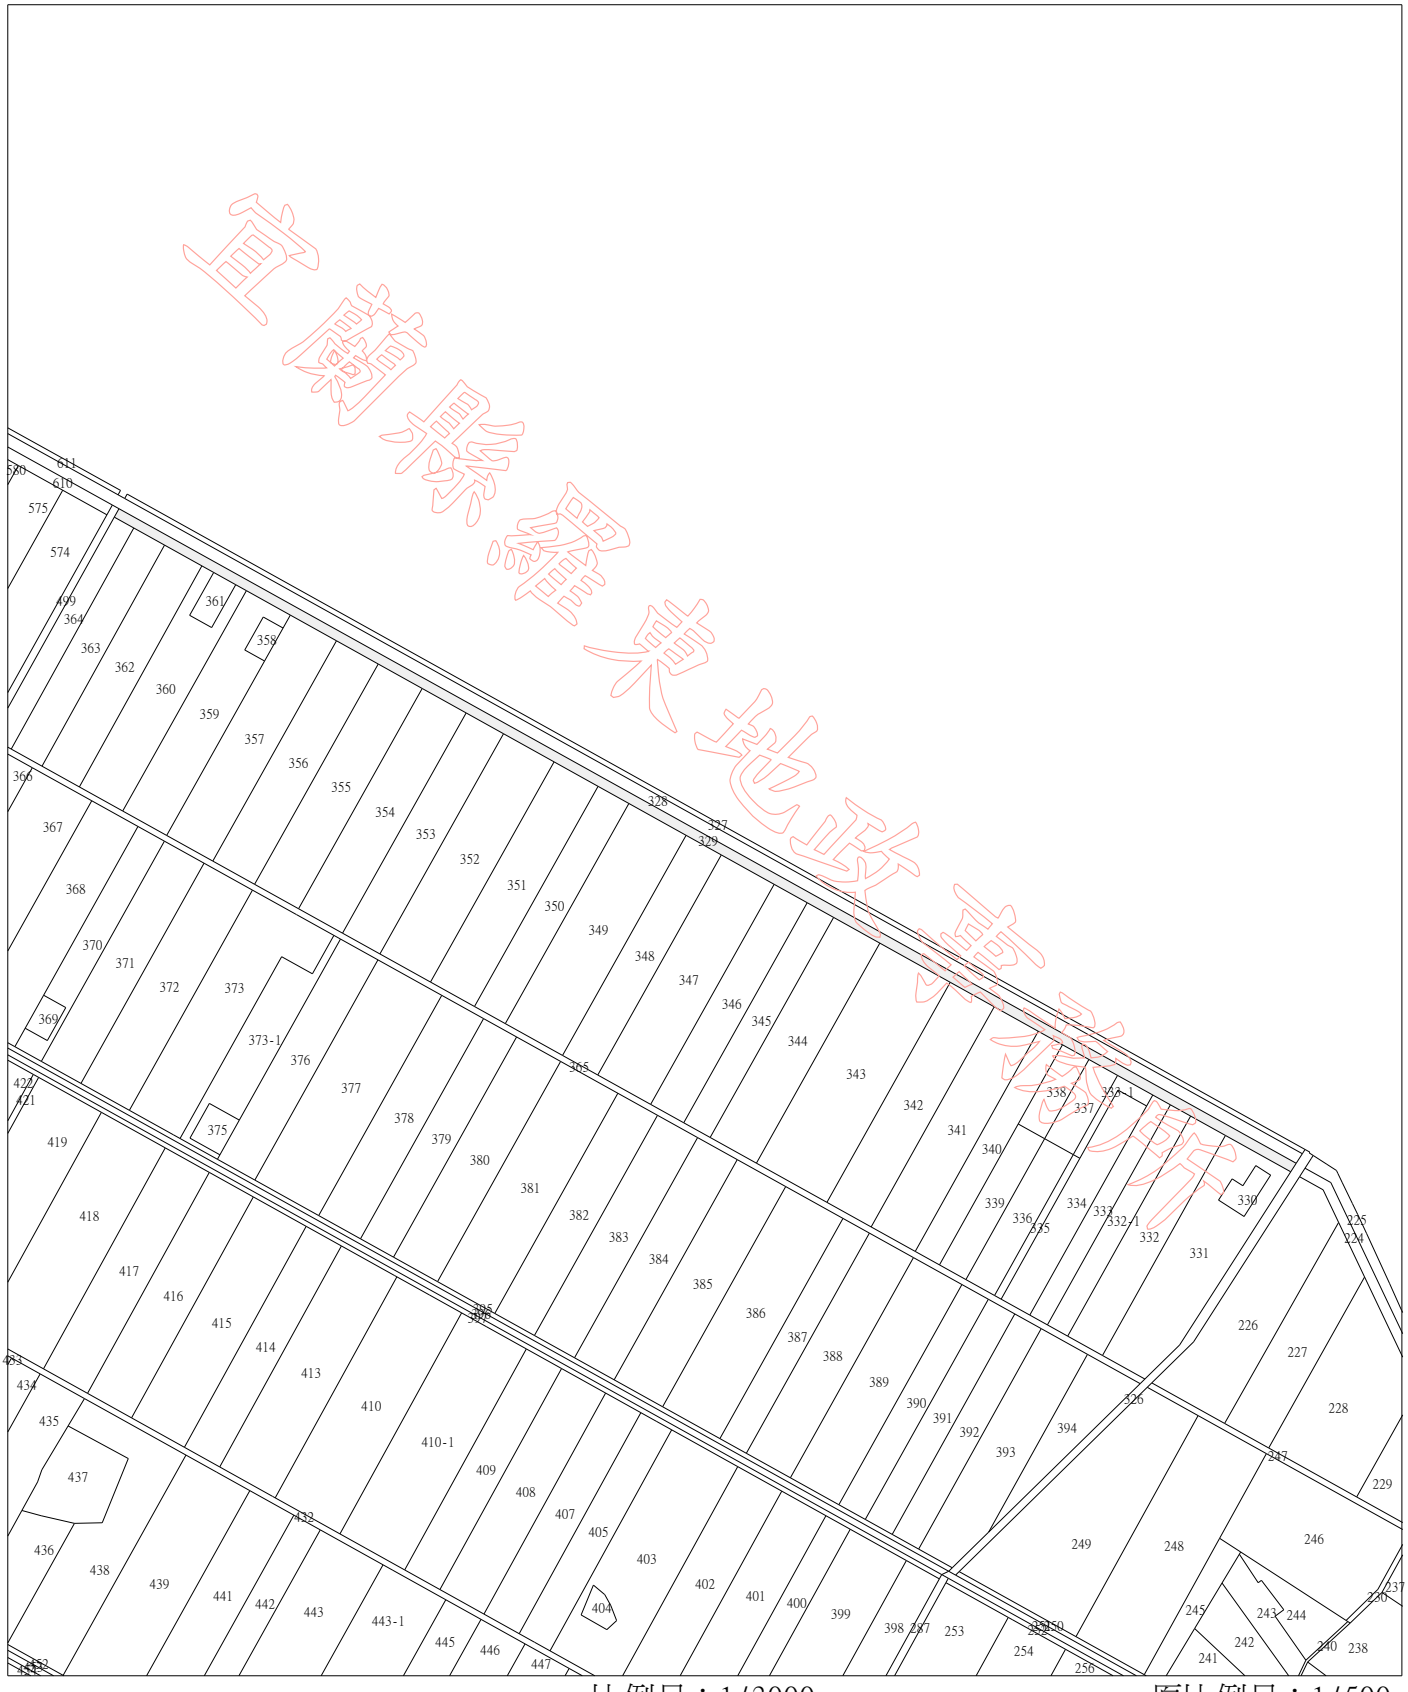

比例尺：1/3000　　原比例尺：1/500

本謄本係網路申領之電子謄本，由張哲源自行列印

謄本種類碼：TXQU8!XN5W27，可至：https://ep.land.nat.gov.tw 查驗本謄本之正確性

惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度，線上有效查驗期限為三個月。

【待補】

梅山段349地號 土地登記第二類謄本

雲端只找到329地號謄本(115/9/12 列印)。349地號請到羅東地政或網路申領電子謄本後放在這一頁。申請書寫明謄本「正本至少一份」。

附件11

土地使用同意書

土地使用同意書

本人陳文政為下列土地之所有權人,茲同意政達木業有限公司二廠(統一編號89497279)於本人所有之下列土地,施設跨越梅花排水之出入版橋(既設)及生活污水放流管線,並將生活污水排入宜蘭縣政府管理之區域排水「梅花排水」,作為申請宜蘭縣政府水利事業(跨越水道)建造物(縣管河川、區域排水及野溪搭排水專用)許可之用。

鄉鎮市	地段	小段	地號	面積(㎡)	權利範圍
冬山鄉	梅山段	－	349	2,602.16	全部

一、使用範圍:(一)廠區正門口既設版橋之橋臺銜接範圍;(二)放流管線自廠內化糞池、放流池經廠區正門口至梅山段 329 地號介入口之管線埋設範圍(詳申請書件設計圖說)。

二、使用期間:自宜蘭縣政府核准之日起至中華民國 119 年 12 月 31 日止;期滿如經許可展延,同意期間隨同延長。

三、本同意書僅供上開申請使用,不作其他用途。

此致

宜蘭縣政府

立同意書人(土地所有權人):陳文政　　(簽名蓋章)

身分證統一編號:G120582948

住址:宜蘭縣冬山鄉梅林路 571 之 1 號

電話:0932-164882

被同意人(申請人):政達木業有限公司二廠　　(蓋公司大小章)

代表人:陳文政

住址:宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路 571-1 號

中　華　民　國　　年　　月　　日

正　本

檔　　號：
保存年限：

農業部農田水利署　函

地址：231002 新北市新店區北新路1段45巷5號6樓
承辦人：陳駿毅
電話：03－9255000#257
傳真：03－9252190
電子信箱：cychen@ila.ia.gov.tw

269
宜蘭縣冬山鄉梅林路571-1號

受文者：政達木業有限公司二廠

發文日期：中華民國115年10月28日
發文字號：農水宜字第1158104356號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明五

主旨：有關貴公司二廠所經木竹製品製造工廠座落宜蘭縣冬山鄉梅山段349地號，申請使用本署同段329地號水利用地(區域排水：梅花排水，管理機關：宜蘭縣政府)一案，經本署審查許可，詳如說明，請查照。

說明：

一、依據貴公司二廠115年9月23日申請許可排放於農田水利設施範圍內之搭排(土地使用)申請書辦理。

二、處分相對人：政達木業有限公司二廠，負責人：陳文政(宜蘭縣冬山鄉梅林路571-1號)。

三、事實及許可內容：

(一)貴公司二廠所提之搭排水土地使用申請書，業經本署宜蘭管理處辦理初勘並審查完成。

(二)本案搭排水土地使用申請內容如附件。。

(三)許可時間：自115年9月23日起至119年12月31日止(期滿後倘欲繼續使用，應於期間屆滿前二個月至六個月內，填具展延申請書至本署宜蘭管理處羅東工作站申辦)。

四、本案係申請水利用地土地使用，其排放渠道為宜蘭縣政府管理，請另案向該主管機關申請排放許可，倘未申請或申請未許可時，本函自始不生效力。

五、檢還貴公司二廠申請許可排放於農田水利設施範圍內之搭排申請書附件一份。

正本：政達木業有限公司二廠
副本：農業部農田水利署、本署宜蘭管理處水資源管理股(含附件)、本署宜蘭管理處羅東工作站(含附件)

署長 蔡昇甫

附件12

其他

檔　　號:
保存年限:

宜蘭縣政府 函

地址：260011宜蘭縣宜蘭市南津里13鄰縣政北路1號
承辦人：賴寶如
電話：03-9251000#1823
傳真：03-9253590
電子信箱：polo711025@mail.e-land.gov.tw

受文者：本府工商旅遊處

發文日期：中華民國113年11月22日
發文字號：府旅商字第1130980315號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明 (376420000A_1130980315_ATTACH1.pdf)

主旨：貴公司二廠所提工廠改善計畫，經查符合特定工廠登記辦法第8、9條規定，准予核定，請查照。

說明：

一、復貴公司二廠112年2月21日工廠改善計畫大綱、112年6月29日工廠改善計畫、112年10月16日未具文號函及113年10月21日補正文件。

二、核定工廠改善計畫期限及內容如下：

(一)工廠改善計畫期限，自本函核定之日（即發文日）起2年內依說明三應改善措施改善完成，如有正當理由未改善完成，得於改善期限屆滿前3個月之前申請展延，但展延期間不得超過中華民國119年3月19日。

(二)工廠改善計畫經核定後，如有特定工廠登記辦法第12條規定情形之一者，申請人應申請變更；其有展延原核定改善期間者，應一併提出申請。

(三)經核定之工廠改善計畫，有特定工廠登記辦法第13條規

工商科　　收文:113/11/22
C01130014541　有附件

定情形之一者，將以書面予以撤銷或廢止，已繳納之納管輔導金不予退還。

(四)工廠現況描述：

１、廠名：政達木業有限公司二廠。

２、廠址：宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路571-1號。

３、座落地號：宜蘭縣冬山鄉梅山段349地號。

４、組織型態：有限公司；負責人：陳文政。

５、使用電力容量、熱能：336馬力、0瓩；用水量：2.25立方公尺／日。

６、產業類別：14木竹製品製造業。

７、主要產品：1403建築用木製品(木門)。

８、土地使用分區及用地類別：特定農業區、農牧用地。

９、廠地面積：2,602.16平方公尺，廠房面積：1,322.14平方公尺。

１０、建築物面積：643.73平方公尺，建築物及廠房面積合計：1,965.87平方公尺。

三、提出特定工廠登記前，應改善措施：

(一)本案已達供公眾使用建築物標準，若建築物有承載固定結構物情形者，需合併計算檢討，待完成補強改善後，取得建築物結構安全證明書或鑑定報告書。

(二)請依照各類場所消防安全設備設置標準設計、監造、裝置，並提出消防主管機關核發之竣工查驗合格文件。

(三)本案計畫搭排水路(梅花排水)屬本府轄管，應向農業部農田水利署宜蘭管理處取得冬山鄉梅山段329地號土地使用同意後，再向本府提出搭排申請。

四、本案係依據貴公司二廠提送之工廠改善計畫書件進行審查，倘所提資料有錯誤不實、變更或不完全之陳述，致本府判別產生差異，應由貴公司二廠自負相關法律責任。

五、應遵行或注意事項：

(一)貴公司二廠依核定之工廠改善計畫完成改善後，應提出特定工廠登記申請書，並檢附特定工廠登記辦法第15條規定之相關文件，申請特定工廠登記。

(二)貴公司二廠應於納管之日起至取得特定工廠登記為止，每年3月19日前繳交當年度納管輔導金新臺幣10萬元整，未繳交者，經通知後未於30日內補繳，將駁回納管申請並廢止核定之工廠改善計畫。

(三)依「宜蘭縣非都市土地申請用地變更興辦事業計畫設置雨水貯集滯洪池、生活雜排水二次淨化設施設計及審查原則」，本案申請面積逾0.05公頃，請於興辦事業計畫內提用排水計畫送本府審查。

(四)本案就所附資料：

1、目前非屬環境部所指定公告之固定污染源，日後若欲設置經環境部指定公告應申請設置及操作許可證之固定污染源前，應依空氣污染防制法第24條規定，取得相關許可證後，始得為之。

2、目前非屬環境部指定公告之事業，尚不須提報事業廢棄物清理計畫，爾後一般事業廢棄物實際或設計最大月產量平均每日1公噸以上，或一般事業廢棄物實際或設計產量每年300公噸以上；應檢具事業廢棄物清理計畫書送本府環境保護局審核。

3、本案若於作業環境內，貯存經中央主管機關依水污染防治法第33條第1項公告指定之物質之下列貯存設施，應依防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法辦理，其設施包括儲槽、罐、桶，及與儲槽相連接之輸送設備，其容積合計達200公升以上。但不包括密閉、未拆封或倒置後不會洩漏者：（1）地下儲槽系統：指地下儲槽，或地下儲槽及與其相連接之輸送設備。（2）地上儲槽系統：指地上儲槽，或地上儲槽及與其相連接之輸送設備。（3）貯存容器：指於地上或建築物，未與輸送設備相連接並可移動之槽、罐、桶。

4、現階段非屬水污染防治法事業分類及定義之事業，惟爾後倘欲從事水污染防治法事業分類及定義之事業，每日最大廢（污）水產生（設計）量達20立方公尺（公噸/日）以上時，請依水污染防治法第13條或第14條規定，於營運前檢具水污染防治措施計畫或許可證（文件）申請文件，由本府環境保護局審查核准後，始得為之。

5、本案非位於本縣目前已公告之飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離範圍內。惟若有設置飲用水連續供水設備（飲水機）供公眾飲水用，請依飲用水管理條例相關規定檢驗水質及設備維護紀錄。

6、本案建築物污水若經認定不須設專用污水下水道者，其所排放之生活污水（包含洗滌污水、廚餘污水、馬桶污水等）仍應符合建築物污水處理設施之放流水標

準。（水污染防治法第7條）

7、本案經貴公司二廠切結產製過程無須用水，故無事業廢水產生及排放，僅一般員工生活污水，請確實依切結事項辦理。

六、本案於依工廠管理輔導法第28-5條第4項所定改善期間，不適用同法第30條第1款及區域計畫法第21條、國土計畫法第38條、都市計畫法第79條及建築法第86條第1款、第91條第1項第1款規定。

七、依經濟部111年1月27日召開「工廠管理輔導會報第八次會議」紀錄，倘貴公司（商業）於納管後，有特定工廠登記廠地範圍內之105年5月20日以後新增，且超過105年5月19日以前之建物投影面積之建物，請於申請特定工廠登記前自行拆除完成，始同意貴公司二廠特定工廠登記。

八、貴公司二廠對本處分如有不服者，應於本處分送達之次日起30日內，繕具訴願書正、副本（均含附件）與本處分書影本送交本府，經由本府向經濟部提起訴願。

九、副知財政部國有財產署北區分署宜蘭辦事處，倘本案建築物或廠地占用公有地，請依權責查處。

十、檢還工廠改善計畫1份。

正本：政達木業有限公司二廠、受託人：鄭玉屏

副本：財政部國有財產署北區分署宜蘭辦事處(含附件)、台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處(含附件)、台灣自來水股份有限公司第八區管理處(含附件)、農業部農田水利署宜蘭管理處(含附件)、宜蘭縣政府財政稅務局羅東分局(含附件)、宜蘭縣政府環境保護局(含附件)、宜蘭縣政府消防局(含附件)、本府建設處國土計畫科(含附件)、本府建設處使用管理科(含附件)、本府建設處建築管理科(含附件)、本府地政處(含附件)、本府水利資源處(含附件)、本府農業處(含附件)、本府工商旅遊處(含附件)

電子公文交換章 2024/11/22 11:19:08

正　本

檔　　號：
保存年限：

宜蘭縣政府　函

地址：260011宜蘭縣宜蘭市縣政北路1號
承辦人：高于惠
電話：9251000#1832
電子信箱：amy833084@mail.e-land.gov.tw

265
宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路571號

受文者：受託人：鄭玉屏

發文日期：中華民國115年8月28日
發文字號：府旅商字第1150152621號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：貴廠依特定工廠登記辦法申請工廠改善期限展延案，准予展延至116年5月21日，請查照。

說明：

一、復貴廠115年8月20日政木字第1150820001號函。

二、依特定工廠登記辦法第11條規定，申請人未能於核定之改善期限內完成改善且有正當理由者，得於改善期限屆滿前3個月之前申請展延，惟展延期限不得逾中華民國119年3月19日。另如有同辦法第12條規定應辦理變更登記事項之一者，申請人應向本府申請變更；其涉及原核定改善期間之展延者，應併同提出申請，併予敘明。

訂

三、經核定之工廠改善計畫，如有特定工廠登記辦法第13條規定情形之一者，本府將以書面撤銷或廢止其核定，已繳納之納管輔導金不予退還。

線

四、貴廠應依核定之工廠改善計畫完成改善後，應提出特定工廠登記申請書，檢附特定工廠登記辦法第15條規定文件，申請辦理特定工廠登記。

五、貴廠自納管之日起至取得特定工廠登記為止，應於每年3月19日前繳納當年度納管輔導金新臺幣10萬元整；屆期未繳納者，經通知限期30日內補繳仍未繳納，本府將駁回納管申請並廢止核定之工廠改善計畫。

正本：政達木業有限公司二廠、受託人：鄭玉屏

附件12-2

農業部農田水利署 搭排申請書件(影本)

本公司二廠115年9月23日向農業部農田水利署宜蘭管理處申請「排放於農田水利設施範圍內之搭排(土地使用)」,經該署115年10月28日農水宜字第1158104356號函許可(期間至119年12月31日)。以下為當時送件之搭排申請書、非農田排水搭排切結書及應檢附文件影本,供參。

附件1、申請書範本

農田水利設施範圍內之搭排
申請書

申請人政達木業有限公司　　為使用貴署宜蘭 管理處羅東 管理分處之農田水利設施申請搭排

■ 許可

□ 展延許可　　於農田水利設施範圍內

□ 變更許可

填具申請事項如下：

申請人基本資料				
申請人名稱（或法人名稱）		政達木業有限公司	代表人/負責人姓名	陳文政
申請人國民身分證統一編號或其他身分證明文件字號（或營業人統一編號）		89497279	代表人/負責人國民身分證統一編號或其他身分證明文件字號（或營業人統一編號）	G120582948
坐落地點	基地地段號	宜蘭縣/市冬山鄉(鎮市區) 梅山段 小段 349 地號		
	基地地址	宜蘭縣 市　冬山鄉 鎮市區　梅林路　段　巷　弄　571-1 號　樓		
使用農田水利設施名稱（介入渠道名稱）		渠道名稱：梅花排水鹿埔八中排(　　K+　　M)		
申請人（代表人/負責人）聯絡電話		03-958-5175		
申請人（代表人/負責人）聯絡地址		269宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路571-1號		
檢附資料		■委託書(含受委託人身分證明文件影本)。 ■計畫書/現況說明書(申請許可及申請展延許可使用)。 □變更計畫書(申請變更許可使用)。 □原許可函(影本)(申請變更許可使用)。		

此致

農業部農田水利署

申請人：政達木業有限公司 （簽章）

受委託人：鄭玉屏　　（簽章）

中　華　民　國　　年　　月　　日

申請搭排-備註事項
1.申請人或受委託人對於本申請書暨檢具之附件所填載之內容，如有虛偽不實或損害善意第三人時願負一切法律責任。 2.申請範圍內土地如有糾紛由申請人自行負責解決。 3.其他身分證明文件包括外僑居留證；不包括駕駛執照、健保卡或護照。 4.展延申請者，應依農田灌溉排水管理辦法第15條相關規定提出申請。 5.變更申請者，應依農田灌溉排水管理辦法第17條相關規定提出申請。 6.承5，變更申請應檢附原許可函(影本)向主管機關提出申請。

使用農業部農田水利署非農田排水(搭排)切結書

立切結書人(即搭排戶)： 政達木業有限公司 （簽章）

申請之土地座落：宜蘭 縣市 冬山 鄉鎮市 梅山 段 — 小段 349 地號

流 入 口 地 點：宜蘭 縣市 冬山 鄉鎮市 梅山 段 — 小段 329 地號

使用 渠道名稱 ：梅花排水 幹線大排 支線中排 分線小排 — 小給補排 。

因使用農田水利署(下稱貴署)農田水利設施供非農田排水(下稱搭排)使用，除遵守有關法令外並具切結及同意條件如下：

一、立書人申請使用貴署之搭排水，除當遵守農田水利法第 14 條規定:「農田水利設施範圍內，未經主管機關之許可不得擅自排放非農田之排水；其屬灌溉專用渠道原則禁止。前項具非農田排水之需求者，應檢附計畫書向主管機關申請許可，其排放水質並應符合公告灌溉水質基準值」外，並同意依農田水利法及其他等相關法令規定辦理。

二、立書人同意在申請使用貴署渠道搭排放流水體如經貴署審查建議有影響灌溉水質之虞時，將自行施設適當處理設施(如技師簽證之二次淨化設施)，並於符合農田灌溉排水管理辦法所規定之灌溉水質基準值後，再排入所申請之排水渠道。

依農田灌溉排水管理辦法第 18、19、20、21 條之規定，如立書人所申請之搭排水有水質檢驗不符灌溉水質基準值或排放水量超過許可時，同意配合貴署法規辦理停止排放及限期改善；期限內仍未改善者，同意依農田水利法第 29 條由貴署逕為裁處及向水利、環境保護主管機關舉發；倘其水質不符放流水標準之規定者，亦同意貴署逕為報請環境保護主管機關依法處理。

立書人倘有違反農田灌溉排水管理辦法第 18 條規定，同意貴署廢止搭排許可。

立書人倘因水質污染發生損害他人權益時，除配合相關主管機關裁罰外，並同意負損害賠償與善後處理責任。

三、立書人申請渠道搭排水量及期限：

(一)搭排水量：每日最大量 2.25 立方公尺/日；年搭排水量 821.25 立方公尺/年。

立書人同意一般農舍及集合式住宅，每戶每日搭排水量以不低於 0.9 立方公尺/日為計算基準，以避免違反農田灌溉排水管理辦法第 18 條第 1 項第 4 款規定。

(二)使用期限：依貴署核定許可期限。

四、立書人搭排水工程設施經許可後施工，同意配合貴署建議意見辦理修正，其所需工程費用由立書人負擔。

五、搭排水工程設施須使用他人土地時，立書人同意自行依法解決後，再提出申請；於申請後發生者，亦同。

六、立書人使用期限同意按貴署收費標準及徵收方式繳納搭排水使用費，並於指定地點及期限完納，倘未於通知期限內完成繳納使用費者，貴署得視為立書人放棄本申請案。

七、立書人於使用期間如須變更名義或轉讓他人時，應先提出變更申請，於經貴署同意後，由接續使用人另立切結書履行。立書人若未完成上述變更程序時，同意貴處得廢止原搭排許可；倘因此致接續使用人或貴處發生損害，願負賠償責任；另接續使用人如於該使用期間違反農田水利法相關法令時，立書人亦同意與接續使用人共同並連帶負擔全部責任。

八、使用期限有延長之必要時，於期限屆滿前 2 個月至 6 個月內，立書人同意自行向貴署提出辦理展延申請。

九、立書人於使用期間須終止使用或變更搭排水量時，應於終止或變更前 30 日向貴署提出變更申請，否則其使用費同意照繳或無須退還。

十、立書人向貴署提出於取得農舍、住宅或事業之建築物使用執照並有實際使用後三個月內，同意自行會同貴署宜蘭管理處所屬工作站取水送驗後，檢附水質檢驗報告提送貴署宜蘭管理處備

查，所檢測之項目應符合農田灌溉排水管理辦法第 20 條之規定，其檢驗所需費用由立書人自行負擔。

十一、使用期間立書人如有下列情事之一者，切結願負立即改善責任，否則同意貴署依農田水利法及相關辦法逕為處理，且貴署有權拆除或封閉其設施放流口，其所有損失或損害貴署無須負任何補(賠)償責任。

（一）經貴署通知限期改善水質，改善期限屆期仍未完成改善者。

（二）搭排水水質違反本切結書第二條之水質標準。

（三）搭排水工程設施與核定設計不符。

（四）搭排水工程設施不良影響渠道結構及輸水安全。

（五）搭排水之使用渠道發生堵塞妨害通水、妨害公共利益或他人權益。

（六）使用情形與核准範圍不符。

（七）未申請搭排許可核准前，自行接管排放者。

（八）未能配合管理處之水質監視作業。

（九）未於完成房舍興建並有實際使用後，補送水質檢驗報告。

（十）原申請興建農舍及住宅或事業變更作其它使用。

（十一）其他有影響渠道水質、環境及公共利益等情事時。

十二、貴署因公務或公益上須限制或停止使用外，如經通知立書人配合改善或拆除之設施物，逾期不履行或終止使用之設施物不拆除恢復原狀時，立書人同意得由貴署代為處理，其費用悉由立書人負擔，且貴署無須退還已使用期間所繳之費用。

十三、因天然災害或不可抗力情事致貴署設施損壞不能使用時，立書人同意立即停止使用，且因此所生之損失或損害，貴署無須補（賠）償及退還已使用期間所繳費用。

十四、因配合政府污水下道工程接管已無須繼續使用時，立書人同意立即停止使用，且貴署無須退還已使用期間所繳費用。

十五、立書人使用期間，如渠道下游有附屬構造物(如水門、制水閘等)啟閉調節供水、排水作業需求時，立書人應無條件同意配合貴署宜蘭管理處之作業，其如有未符合立書人使用特性，可另案申請變更改排，不得要求貴署負補（賠）償之責。

十六、立書人已許可使用搭排渠道，倘認為有改排需求時，仍須提送申請經貴署核定許可，其所增加工程費用將自行負擔，且無須退還原已許可使用搭排期間所繳費用。

十七、立書人於使用期間不得要求貴署改善相關農田排水路。

十八、立書人因故未興建申請延期(一般家戶及農舍得延期期限為 2 年內；非一般家戶及農舍得延期期限為 6 個月內)，僅能延期一次。

十九、立書人經申請許可後因故滿 2 年未興建者，如有使用需求，同意原案廢止並重新提出申請。

二十、立書人如違反上述切結或同意之各條款內容致貴署蒙受損失或損害時，立書人應負補（賠）償之責。

二十一、檢附正本一式四份。

此　致

農業部農田水利署(宜蘭管理處)

具切結書人(搭排戶)　:政達木業有限公司　　(簽章)

身分證字號(統一編號):89497279

住　　址：269 宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路 571-1 號

電　　話：(03)958-5175

中　華　民　國　　年　　月　　日

附件**5-1**、應檢附文件**-1(**非一般家戶及農舍**)**

一、申請人身分證明文件影本

☐ 以個人名義申請者申請人身分證明文件正反面影本。

■ 以法人名義申請者，檢附公司設立登記或變更登記表及代表人國民身分證影本。

☐ 以商號名義申請者，檢附設立或變更登記證明文件及負責人身分證影本。

☐ 政府機關、公有公用事業機構及公法人，得不需檢附設立證明文件影本。

■ 委託他人申請者，檢附(附件2)委託書及受委託人身分證明文件。

請黏貼(或檢附)身分證明文件影本，並加蓋申請人具法定效力印章及「與正本相符」字樣。





僅供特定工廠申請文件用-他用無效

附件**5-1**、應檢附文件**-2(**非一般家戶及農舍**)**

二、位置圖面

應檢附項目：

■ 介入點位置圖。

■ 涉及工程者，其工程設計圖說。

■ 借用他人土地者，應含設置於其土地管線位置圖說(圖面需含搭排申請經借用土地至介入點之設置或埋設管線配置圖)。

註：請勾選申請需求之檢附項目。

附件**5-1**、應檢附文件**-3(**非一般家戶及農舍**)**

三、土地證明

應檢附項目：

- ■ 地籍圖謄本(申請日前3個月內)。
- ■ 土地登記第一類謄本(申請日前3個月內)。
- ■ 土地使用同意證明(申請搭排土地非屬申請人所有者及借用他人土地者皆需檢附，另需檢附土地同意者身分證正反面影本並加蓋同意者具法定效力印章及「與正本相符」字樣。)

說明：

1. 依農田灌溉排水管理辦法第10條第1項第3款有需使用土地者，應檢附其土地使用證明文件。
2. 但需要使用之土地，已依農田水利法第23條第1項規定納入農田水利事業作業基金管理者，得免附。
3. 請申請人如實檢附資料，若資料提供不實而使業務執行登載不實，經主管機關查核得依辦法第18條規定廢止搭排許可。
4. 取得之持分及人數，應符合民法第820條或土地法第34-1條之規定，共有人數及持有面積均超過1/2，或持有面積超過2/3，則人數不計。

註：請勾選申請需求之檢附項目。

土地使用同意證明書

工廠生活污水搭排管線及介入口設置

茲有陳文政等人，擬在下列土地作＿＿＿＿使用，使用期間自115年＿月＿日至119年＿月＿日，為期5年，業經陳文政等人完全同意。

特立此同意書為憑。

土地標示及使用範圍						
土地標示				土地登記簿面積(平方公尺)	同意使用土地面積(平方公尺)	備註
鄉鎮市區	段	小段	地號			
冬山鄉	梅山	—	349	2,602.16 m^2	2602.16 m^2	搭排管線
				m^2	m^2	
				m^2	m^2	

土地所有權人及權利範圍			
土地所有權人姓名 (不可電腦打字，須請所有權人親簽及蓋章)	權利範圍 (持分類)	國民身分證統一編號	戶籍地址
1 (簽名) (蓋章)	全部	G120582948	宜蘭縣冬山鄉梅林路571之1號
2 (簽名) (蓋章)			
3 (簽名) (蓋章)			
4 (簽名) (蓋章)			
5 (簽名) (蓋章)			

中　華　民　國　　年　　月　　日

備註
1. 土地所有權人如係未成年人應由法定代理人代理之。 2. 如土地為同意部分使用者，應於地籍圖謄本影印本以斜線表示。另外，取得之持分及人數，應符合民法第820條或土地法第34-1條之規定，共有人數及持有面積均超過1/2，或持有面積超過2/3，則人數不計。 3. 請附上開土地所有權人之身分證影本。 4. 如有土地糾紛由申請人自行解決。

5. 表格內容如不敷使用，請自行新增欄位。

土地所有權人身分證明文件(土地使用同意證明)

請黏貼(或檢附)身分證明文件影本，並加蓋土地所有權人具法定效力之印章及「與正本相符」字樣。

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>土地所有權人國民身分證影本黏貼處

(正面)</td>
<td>土地所有權人國民身分證影本黏貼處

(背面)</td>
</tr>
<tr>
<td>土地所有權人國民身分證影本黏貼處

(正面)</td>
<td>土地所有權人國民身分證影本黏貼處

(背面)</td>
</tr>
</table>

*內容如不敷使用，請自行新增欄位。

附件**5-1**、應檢附文件**-4(**非一般家戶及農舍**)**

四、建物證明

應檢附項目：

■ 建築物建照執照影本(限一般家戶及農舍)。

□ 建築物使用執照影本。

□ 尚未取得建築物使用執照者，得免附；本署審核同意後應核發保留廢止權之許可。

註：1.請勾選申請需求之檢附項目。
2.請於影本加蓋「與正本相符」字樣。

附件**5-1**、應檢附文件**-5(**非一般家戶及農舍**)**

五、水質檢驗報告

應檢附項目：

☐ 申請日前3個月內，具認證實驗室出具之水質採樣檢驗報告書。

註：水質檢驗報告，其樣品之採樣、保存、檢測、品質管制方式應依「**非農田排水之灌溉水質基準值檢測方式及品質管制作業準則**」規定，且依據環保署公告標準方法及相關指引，並取得相關許可之檢驗室辦理。為符合前揭規定，水質採樣作業亦應由取得採樣方法許可之認證檢驗室派員執行。

☐ 尚未取得建築物使用執照者，應於取得並實際使用後3個月內檢附。

(預計取得日期：___年___月___日)

註：請勾選申請需求之檢附項目。

水質檢驗報告之灌溉水質基準值說明：

1. 下游不具引灌需求之渠道者，應檢附灌溉水質基準值之管制項目包含總鉻(Cr)、鎳(Ni)、銅(Cu)、鋅(Zn)、鎘(Cd)、鉛(Pb)、砷(As)、汞(Hg)及氫離子濃度指數(pH 值)等共9項。

2. 下游具引灌需求之渠道者，應檢附灌溉水質基準值之管制項目及品質項目包含總鉻(Cr)、鎳(Ni)、銅(Cu)、鋅(Zn)、鎘(Cd)、鉛(Pb)、砷(As)、汞(Hg)、氫離子濃度指數(pH 值)、導電度(EC)、懸浮固體(SS)、氨氮(NH_3-N)、鈉吸著率(SAR)、殘餘碳酸鈉(RSC)、氯鹽(Cl^-)、硫酸鹽(SO_4^{2-})、溶氧(DO)、陰離子界面活性劑及油脂等共19項。

附件**5-1**、應檢附文件**-6(**非一般家戶及農舍**)**

六、現場照片表

	
拍攝日期： 2026/09/02 拍攝地點 廠區大門口（含門牌）	拍攝日期： 2026/09/02 拍攝地點：廠區全景
	
拍攝日期： 2026/09/02 拍攝地點：化糞池／放流池	拍攝日期： 2026/09/02 拍攝地點：介入點（放流口）
	
拍攝日期： 2026/09/02 拍攝地點：介入渠道上游	拍攝日期： 2026/09/02 拍攝地點：介入渠道下游

註：尚未完工(施工)者，檢附施工(前)中現場照片，並於完工後1個月內檢附完工現場照片。

附件**5-1**、應檢附文件**-7(**非一般家戶及農舍**)**

七、切結書

立切結書人政達木業有限公司為申請搭排事宜，申請基地位於宜蘭冬山鄉縣/市梅山區－段＿＿＿小段329地號，申請搭排之水質特性為：

☐ 一般家戶及農舍申請排放生活污水，且搭排水質：
☐符合灌溉水質基準值管制項目限值。
☐符合灌溉水質基準值管制項目及品質項目限值。

■ 非一般家戶及農舍申請僅排放生活污水，且搭排水質：
☐■符合灌溉水質基準值管制項目限值。
☐符合灌溉水質基準值管制項目及品質項目限值。

☐ 非一般家戶及農舍申請排放非生活污水，且搭排水質：
☐符合灌溉水質基準值管制項目限值。
☐符合灌溉水質基準值管制項目及品質項目限值。

一、許可排放期間，若變更作為其他目的使用或造成農業損害，具切結書人願負一切損害賠償及刑(民)事責任。

二、申請範圍內土地如有糾紛由申請人自行解決。

本人提供給農田水利署宜蘭＿＿管理處搭排申請之相關檢附資料皆如實檢附，若資料未如實提供而使業務機關執行或登載不實，願負一切法律責任，特此切結為憑。

此　致

農業部農田水利署

立切結書人：政達木業有限公司　　（簽章）

國民身分證統一編號或其他身分證明文件字號（或營業人統一編號）：89497279

代表人/負責人：　陳文政　　（簽章）

聯絡電話：(03)958-5175／0932-164882

聯絡地址：269 宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路571-1號

中　華　民　國　　年　　月　　日

附件**5-1**、應檢附文件**-8(**非一般家戶及農舍**)**

八、事業登記證明

應檢附項目：

☐ 工廠登記證明文件影本。

☐ 特定工廠登記證影本。

☐ 農產業事業登記證影本。
（如畜牧、畜禽、水產養殖、農產業初級加工場等或其他相關證明）

■ 其他：宜蘭縣政府工廠改善計畫核定函（府旅商字第 1130980315 號）

註：1.請勾選申請需求之檢附項目。
2.請於影本加蓋「與正本相符」字樣。

附件**5-1**、應檢附文件**-9(**非一般家戶及農舍**)**

九、事業環保證明

應檢附項目：

☐ 已申請水污染防治措施計畫及許可，尚未取得許可證者，應檢附環保主管機關受理申請證明文件影本。

☐ 已取得水污染防治許可證者，應檢附其許可證影本。

■ 相關主管機關以公文說明無事業製程廢水產生。(申請排放生活污水)

註：1.請勾選申請需求之檢附項目。
2.請於影本加蓋「與正本相符」字樣。
